

工序依赖图覆盖不到的损坏:无冲突柔性作业车间的时空预约闭包

QI YU, Southeast University, PR China

WEI LI*, Southeast University, PR China

在同时用工序依赖刻画加工先后、又用时间窗预约记录走廊占用的柔性作业车间调度中,扰动后划定重调度范围的现成做法仍是先找出受影响工序、再连同其后续一并重排。但走廊在某段时间内不可通行或通行变慢时,没有任何工序因此无法执行,该做法给出空范围、判为无需重调度;而落在受扰时段内的走廊占用已经失效,原排程不可行,等待还会沿让行关系传给后续车辆。缺口不在检测,而在工序依赖图不含走廊占用之间的让行关系。

本文把重调度范围定义在走廊占用及其依赖关系上,给出时空预约闭包(STRC),正文亦称预约影响集:以占用时段与扰动时间窗重叠的走廊预约为起点,沿同走廊让行、同一车辆的后续占用、同一工件与同一机器下一道工序的占用四类边取传递闭包;集内占用允许改写,集外沿用原计划。依赖边一经给定,一条占用是否属于该集即唯一确定,不随改路算法的实现而变。恢复分两级:先在集内为原车改路,仍不可行时再按既定顺序扩大允许改写的范围。

在5算例 $\times 10$ 个随机种子共50对上,走廊阻断时按工序依赖图划出的范围50/50为空而原排程确已不可行;同一套改路程序只换划界对象,恢复可行率由0/50变为50/50;集内无指向集外的依赖边、集外占用的走廊、时段与车辆逐条不变,两项各50/50与50/50。把允许改写的集合换成「决策时刻之后尚未结束的全部占用」、其余不变时,耗时与完工时间几乎不动,改写比例却由0.540升到0.604(逐格31/18/1, Wilcoxon符号秩双侧 $p = 8.8 \times 10^{-7}$)。相对不改写已结束占用的热启动全局重调度,有界修复耗时低两到三个数量级,但完工时间在全部预算档上更差、放宽预算不出现反超,在完工时间上不能替代它。

主效应来自划界对象:上段的可行性恢复只因换了它,改路程序未动。次效应来自影响集本身,即更少改写;但它已覆盖「尚未结束的全部占用」的约92%,两者接近时该收益趋于消失,故不作最小性声称。集内改路、集外保持、失败后扩大范围都已见于既有工作;本文主张的不是新的修复策略,而是划界对象。

CCS Concepts: • **Theory of computation** $\rightarrow$ **Scheduling algorithms**; • **Applied computing** $\rightarrow$ **Industry and manufacturing**; • **Computing methodologies** $\rightarrow$ **Planning and scheduling**.

Additional Key Words and Phrases: 柔性作业车间调度, AGV 无冲突路由, 时空预约表, 时空预约闭包, 走廊阻断

ACM Reference Format:

Qi Yu and Wei Li. 2026. 工序依赖图覆盖不到的损坏:无冲突柔性作业车间的时空预约闭包. 1, 1 (September 2026), 32 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

1 引言

1.1 背景与动机

考虑运输的柔性作业车间调度长期建立在一个便利假设之上:工件在两台机器之间的移动时间是一个常数,可从按位置对索引的矩阵中读出。该假设默认车辆互不共用同一路段,行驶时间因此只由两点之间的距离决定,而不是路由决策的结果。一旦有限车队共享稀疏走廊,并以时间窗预约被争用的路段,行驶时间就不再

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Key Laboratory of Computer Network and Information Integration, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Key Laboratory of Computer Network and Information Integration, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

Manuscript submitted to ACM

是固定数据，而成为两个决策的结果——车辆走哪条路，以及谁先占用了该路段。一辆车的让行会推迟另一辆车的到达，进而推迟后续工序开工及其运输占用。此时一份可行排程须同时确定工序指派、加工顺序，以及一张记录走廊占用的预约表；扰动不仅可以打坏工序，也可以只使走廊占用失效，而不改任何工序指派。

在开工前一次性完成排程、并把机器指派与无冲突路径一同决定的这类研究已经表明：当工序可选多台机器时，车辆在走廊上的争用会改变哪台机器更优——通往加工更快的机器的路段若正被占用，加工较慢但更易到达的机器反而更好。因此，评价候选排程须用时间窗路由计入等待，搜索时还须查询预约表上的冲突，而不能继续使用常数行驶时间 [9, 17, 20]。上述文献回答的是：在信息完备、尚未开工时，如何排出一份高质量的无冲突排程。同一车间在执行到时刻 t_{now} 并发生扰动之后，问题改为：损坏落在哪些走廊占用上、改写到何处才足以恢复可行，以及这件事能否在不必重新开种群搜索的前提下，在毫秒至百毫秒内完成。

1.2 工序依赖图覆盖不到的缺口

在考虑运输的柔性作业车间动态调度研究中，重调度范围通常沿工序依赖图划定：以因设备故障而无法按原计划执行的工序为起点，再把同一工件的后续工序、同一机器上排在其后的工序纳入范围，或在依赖图上从起点起限定步数 θ 后停止，然后只对范围内的工序重调度。两篇带 AGV 运输、并以机器故障或插单为扰动的动态调度研究即按此划界——恢复范围分别取「故障后尚未加工的工序」[24]，与「按扰动影响分为保留、继续、重构三类后的工序与配送任务」[19]（后者为批量流混合流水车间，扰动含车辆故障，但模型中没有预约表）。这一做法可上溯至受影响工序重调度（AOR）[19, 24]。后文设一道按工序依赖图划界的对照，用以复现这一现仍沿用的做法，而不是改进 AOR 本身（第 2.1 节）。

这一划界在扰动本身就是工序事件时往往合理——例如机器故障使若干工序无法按原指派执行。然而，当排程用时间窗记录走廊占用时，还存在一类扰动：它使某条走廊在某段时间内不可通行，而不改任何工序指派。典型例子是走廊阻断：走廊在 $[t_a, t_b)$ 时段禁止通行。阻断不修改机器指派或加工顺序，工序依赖图上因此没有任何被直接波及的工序，按该方法划出的重调度范围为空，并据此判为无需重调度。于是工序依赖图覆盖不到这些必须恢复的走廊占用：原计划中与阻断时段重叠的占用已与禁行冲突，不再可行；一车因此等待或改道，又会沿让行关系挡住后续车辆，失效在预约表上传播。

这里的「覆盖不到」，指工序依赖图按定义不含走廊占用之间的让行关系，因而无法刻画占用失效如何在车辆之间传播，而不是传感器漏检或算法偶然没查到。若运输时间仍取为按位置对索引的常数矩阵，走廊不是可争用的资源，预约表也不存在，这类损坏甚至无法写进模型。因此，该缺口只在用时间窗记录走廊占用的设定下能够成立；这不是把应用范围故意收窄，而是把问题写清楚所必需的前提。

据此，我们区分两类扰动。

- **A 类**（作用于工序依赖图）：机械臂故障、加工时间显著偏差、插单，以及车辆故障。这类扰动使部分工序无法按原计划执行，划定重调度范围时的起点工序集非空；按工序依赖图划界与按预约影响集划界都能给出非空范围，因而不是本文用来检验划界错位的主要对象。车辆故障归入 A 类的理由见第 3.3 节：它虽不改工序指派，却使该车承运的工序不可执行，经「车辆到所承运工序」的对应关系，工序依赖图上仍有非空的起点工序集。
- **B 类**（只作用于预约表）：走廊阻断、走廊通行变慢，以及局部通行权临时取消等。这类扰动不使任何工序无法执行，工序依赖图上的起点工序集为空；与受扰时段重叠的走廊占用非空，以其为起点纳入重调度范围所得的预约影响集也非空。

B 类构成问题层面上的反例：问题不在于现有方法对工序的重调度修得不够好，而在于同时用工序依赖图刻画加工先后、又用时间窗记录走廊占用的模型里，现成的重调度范围仍划在工序依赖图上，而该图表达不了走廊阻断这类扰动。这一错位的条件是模型里同时有这两套对象，却只用工序那一套划界。上引两篇带 AGV

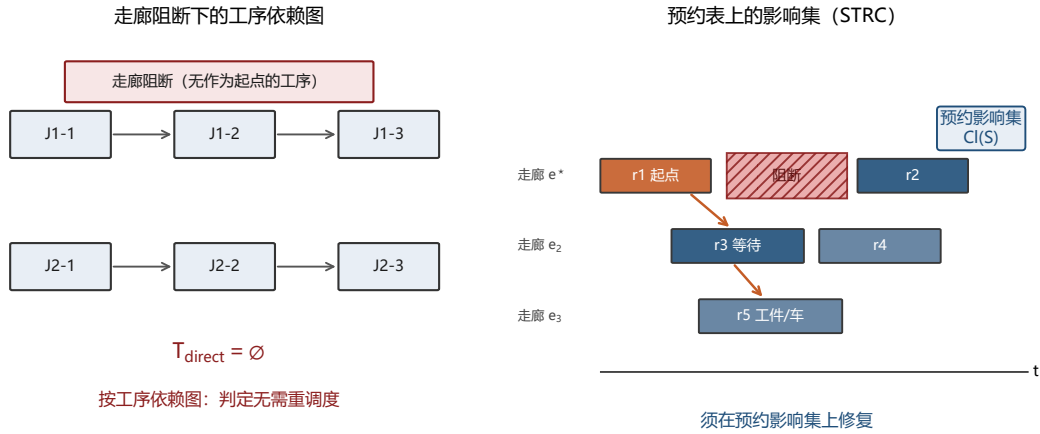


Fig. 1. 动机示意。左:走廊阻断不使任何工序或机器无法按原计划执行,工序依赖图上没有作为起点的工序。右:同一扰动下,与阻断时段重叠的走廊占用成为起点,并沿让行与接续关系形成预约影响集。

的动态调度研究没有出现「范围画在工序依赖图上、因而漏掉走廊阻断」这一问题,是因为它们在模型中不考虑车辆之间的走廊争用(第2.4节),于是只剩下工序依赖图可用来划定重调度范围——这说明错位是在两套对象同时出现时才会发生,而不是某一篇工作的疏忽。因此,本文的主张只针对上述设定,而不是认为所有局部重调度文献都存在这一错位(第2.5节)。图1对照这一缺口:左侧工序依赖图上没有作为起点的工序,因而判为无需重调度;右侧预约表上,与阻断时段重叠的占用成为起点,并沿让行与接续关系形成预约影响集。

1.3 本文主张

本文有三点主张。

第一,当柔性作业车间用时间窗预约保证车辆无冲突通行时,扰动后的重调度范围应定义在由走廊占用及其让行关系构成的预约依赖图上,而不是只定义在工序依赖图上。

第二,划界对象是时空预约闭包(STRC, Spatiotemporal Reservation Closure),即预约影响集:以与扰动时窗重叠、因而失效的走廊占用为起点,沿让行、同一车辆的后续占用、同一工件下一道工序的占用、同一机器上一道工序的占用,把直接或间接必须作废、重写的走廊占用全部纳入重调度范围。这些依赖关系一经给定,影响集以外的占用不再是集内占用沿上述关系的下一步,因而「改写哪些占用」对应一个可以检验的集合,而不是人为设定的搜索半径。

第三,得到影响集之后,在集内为原车改路、集外保持原占用;若仍得不到可行排程,再按同一工件、同一车辆、直至全部未完成占用的顺序,扩大允许改写的范围。A类故障上另允许换车与改派,仍不改加工顺序。这些步骤用来落实影响集并恢复可行排程;本文的主张在于如何划定影响集,而不在这些修复步骤是否新颖。

上述三点共用一个立场:预约影响集是一次测量,不是一个决策。本文不用「谁挡了谁」去引导搜索以更换指派或路径——那是在改进排程决策;消去一处走廊等待之后,另一处约束往往会成为新的瓶颈,完工时间上的收益因此容易被抵消。本文用同一份「谁挡了谁」去划定哪些占用已经损坏:依赖关系给定后,一条占

用是否属于影响集，取决于它能否从起点沿这些关系到达，结果唯一确定，不随之后哪一条约束成为新的瓶颈而改变。

这并不等于声称影响集已经包含物理上所有必须改写才能恢复可行的占用。画哪些依赖边、不画哪些，是建模时的选择；边集一旦选定，影响集对外封闭（集内占用没有指向集外的依赖边）就是该定义的推论（命题 2），不是另外证明出来的性质。影响集是否为恢复可行所需的最小占用集合，本文不作主张：最小集合依赖于允许哪些修复动作，而影响集刻意不绑死某一种修复方法（注 2）。

相对以原排程为起点、在限定时间内重新搜索的全局重调度，预约影响集回答的是另一类问题：在必须很快给出可执行方案时，能否恢复可行，并把改写限制在影响集以内。修复后，影响集以外每条走廊占用的走廊、时段与车辆均与原计划一致——这是边集给定、且集外占用已按原计划成功写入新表时的充分条件（命题 3），不是无条件成立的等式。相对不改写决策时刻已经结束的全局重调度，有界修复得到的完工时间 $C_{\max}$ 更差，两边被改写的占用比例已在同一量级；其长处在于算法耗时短得多（毫秒对秒）。算法耗时与改写比例不应混在一处解释，第 6.9 节已分开测试：耗时短来自对影响集内各段运输各做一次路径规划、不开种群搜索，并不来自影响集本身；至于影响集是否少改写了占用，不能从上述全局重调度对照中读出——两边比例已经接近——而须另设一对照：改路程序相同，唯一差别是允许改写的是影响集，还是尚未结束的全部占用。在测到的 6 个算例-随机种子格上，各搜索时限处全局重调度得到的 $C_{\max}$ 都更小，未观察到有界修复反过来更优的情形。因此，有界修复的作用不是降低完工时间，而是在毫秒内给出可执行的修复方案。按工序依赖图划界时，走廊阻断因找不到受影响工序而不会启动局部重调度，原排程保持不可行。同一扰动若改为启动全局重调度，则可以处理，但算法耗时在秒级。当必须立刻恢复可行时，需要先识别走廊占用上的损坏范围，再选用与之匹配的局部恢复步骤。本文解决的不是找到一种完工时间上更优的重调度算法，而是这件识别与恢复的事。

1.4 贡献

本文的贡献如下。

- (1) 指认工序依赖图覆盖不到的一类损坏。当排程同时用工序依赖刻画加工先后、又用时间窗记录走廊占用时，现成的重调度范围仍按受影响工序划定。走廊阻断、走廊通行变慢等扰动不改任何工序指派，按该方法划出的范围为空，并据此判为无需重调度；但与受扰时段重叠的走廊占用已经失效，原排程不可行，等待还会沿让行关系传给后续车辆。这一缺口不是检测漏检，而是工序依赖图不含占用之间的让行关系；运输时间若仍取为常数矩阵，走廊不是可争用资源，这类损坏甚至写不进模型。
- (2) 把重调度范围定义为预约影响集。以与扰动时窗重叠的走廊占用为起点，沿让行、同一车辆的后续占用、同一工件与同一机器上下一道工序的占用，把直接或间接必须作废、重写的记录纳入重调度范围，得到时空预约闭包（STRC）。依赖关系一经给定，一条占用是否属于影响集唯一确定，集内占用没有指向集外的依赖边，因而「改写哪些」对应一个可检验的集合，而不是人为设定的搜索半径，也不随某一种改路算法如何实现而变。影响集是一次测量，不是一个排程决策：本文用「谁挡了谁」划定损坏，而不用它去引导搜索更换指派或路径。本文不主张影响集已是恢复可行所需的最小占用集合（最小集合依赖于允许哪些修复动作，注 2）。这一层——影响集作为对象是否成立——的证据是：走廊阻断下工序依赖图上的范围为空而原排程确已不可行 50/50（第 6.2 节）、A 类上预约影响集不丢工序依赖图已纳入的占用 50/50（第 6.3 节）、边界消融的差分试探泄漏 0/50。而该划界在净收益上的价值属另一层：本文对此的证据仅有 RA 一组对照（第 6.9 节），即与「改写全部尚未结束的占用」相比少改写多少。
- (3) 给出与该划界相匹配的局部恢复，并分清各项读数各来自何处。在影响集内为原车改路、集外保持原占用；仍不可行时再扩大允许改写的范围。这些步骤用来落实影响集，本身不是本文的方法贡献。在同一套

走廊路网、时间窗路由与无冲突校验下对照表明：按工序依赖图划界时走廊阻断 0/50 恢复可行，按预约影响集划界时 50/50 恢复可行，可行与否来自划界对象，而不是改路程序的优劣；有界修复以毫秒级耗时恢复可行，但完工时间 $C_{\max}$ 较全局重调度更差，且放宽预算不出现反超（12 个算例-随机种子格，所测预算区间内无交叉点）；相对「改写全部尚未结束的占用」的对照，耗时与 $C_{\max}$ 几乎不变，少改写的占用才可归因于影响集（第 6.9 节）。四类扰动与两种划界的交叉中，工序依赖图范围仅在走廊阻断与通行变慢上为空，预约影响集均非空，且在机器或车辆故障上不小于工序依赖图范围。

同一车间、同一预约表上，开工前的一体化排程用预约表构建无冲突方案 [9, 17, 20]；本文在执行时刻用预约表定位损坏范围。二者时机不同，并不互相替代。

1.5 篇章结构

第 2 章按四类回顾相关工作：作业车间如何按工序或时间轴划定重调度范围、铁路调度如何表达排他资源上的占用先后、无冲突多车路径如何做局部重规划，以及考虑运输的柔性作业车间把边界划在何处，并据此说明本文的位置。第 3 章给出走廊预约设定与执行期恢复问题：车间、走廊预约表与工序依赖图，两类扰动，以及恢复须满足的条件。第 4 章定义时空预约闭包，即预约影响集，说明其依赖边与对外封闭等性质（图 2、3）。第 5 章说明如何在影响集内为原车改路、集外保持原占用，以及仍不可行时如何扩大允许改写的范围，并与全局重调度对照（图 4）。第 6 章报告可行性、算法耗时、占用改写比例与完工时间，并用案例甘特把统计结果落到工序时间轴上。第 7 章总结全文，并讨论局限与后续工作。

2 相关工作

动态调度的一个基本问题是：扰动发生后，重调度范围划在什么对象上，即改哪些、其余保持不动。已有文献把这一范围划在不同对象上——工序或时间轴、排他资源上的占用先后、受影响的车辆，以及带运输的柔性作业车间中的工序集合。下面按这四类回顾各自做了什么、尚未覆盖什么，并在表 2 中做汇总。

2.1 作业车间的局部重调度

对机器故障、插单等工序事件，按受影响工序划定重调度范围，在带 AGV 的动态调度中仍被采用。Zhang 等 [24] 处理机器故障与插单，恢复范围取故障后尚未加工的工序；Tang 等 [19] 按扰动影响把工序与配送任务分为保留、继续、重构，并把完全重调度、部分重调度与右移并列，指出右移保住稳定性、让出优化空间。本节与下节据以定位的转述，所本原句一并列于表 1。这一做法可上溯至受影响工序重调度(AOR) [1, 16]：只重排被扰动直接或间接波及的工序。沿时间轴划界与失败后扩大范围同样已有文献研究过，包括 match-up [2] 与增量扩大时间窗的 Local Rescheduling [8]。右移则不判定谁受影响，把未完成部分整体后推。滚动时域与分解式方法在规模与质量之间折中 [23, 26]；综述见 [14, 21]。

这些工作表明，划定范围再局部重调度并不是新问题，前提是扰动首先作用在工序上。一旦扰动只使走廊不可通行而不改指派，按该方法划出的范围可以为空，原排程却已不可行。

2.2 排他资源上的占用先后

「谁先占用同一排他资源」被建成图，在铁路调度中已有系统研究。Mascis 与 Pacciarelli [12] 的 alternative graph 把析取图推广为：顶点是作业对闭塞区段的占用，固定弧表示路径先后，成对的 alternative arc 表示谁先通过该区段。D'Ariano 等人 [4] 用该模型做列车实时重调度，扰动后重算无冲突时刻表，并尽量接近原计划。同走廊上的让行关系与 alternative arc 表达的是同一类先后。

与本文不同的是用法。对每一处争用, alternative graph 给出两条互斥的弧(甲先通过, 或乙先通过), 排程就是从中选定一条: 选定后图中不能出现正权回路, 时刻表才可行, 并尽量使目标最优——占用先后因此是决策变量。本文的计划已经排好, 谁先通过哪条走廊已经确定, 不再选择先后, 只按这些既定的让行与接续关系, 把扰动后必须作废的原走廊占用纳入重调度范围。此外, 铁路模型把闭塞区段当作机器, 工序与占用在同一张图上, 区段不可用就是工序事件, 不存在「范围画在工序依赖图上、因而漏掉走廊阻断」。柔性作业车间里加工与走廊占用是两套对象, 现成的 AOR 划界用不上这一套占用先后。

2.3 无冲突多车路径的局部重规划

在多智能体路径规划中, 只为受影响者进行重调度、其余视为动态障碍, 已是标准做法。Švancara 等人 [18] 在线 MAPF 中给出 Replan All、Replan Single 与 Replan Affected, 并用在线独立性检测确定受影响集合; Malka 等人 [11] 在地图不准确时, 同样只为受观测变化影响的车辆重规划。无冲突路径规划把时空占用作为一等约束, 但起终点通常由外部给定 [25]。

上述做法已经把「只改受影响者、其余保持原计划」做成标准机制, 本文并不把它当作贡献。与本文设定的另一点不同是: 这类工作只有车辆的起终点, 没有工件—工序—机器指派, 因而不会出现「重调度范围按工序依赖图划定, 走廊阻断因找不到受影响工序而被漏掉」。就受影响集合如何得到而言, MAPF 用独立性检测找出受影响车辆, 得到的是检测算法的输出, 随实现方式和停止条件而变。本文给出的预约影响集则不同: 依赖边一经给定, 一条占用是否属于该集, 只取决于它能否从起点沿这些边到达, 与随后用哪一种改路算法无关(第 4.2 节)。

2.4 考虑运输的柔性作业车间调度

考虑运输车辆的柔性作业车间调度已有系统综述 [22]。近期组合优化工作仍普遍把行驶时间取为按位置对索引的常数矩阵, 并在此之上发展约束规划、元启发式与知识引导搜索 [5, 13, 15]。该约定下车辆并不争用同一路段, 走廊阻断在模型里没有对应对象, 无法被检验。

一旦用时间窗记录走廊占用, 加工先后与走廊占用同时进入模型。拥堵感知派车可用局部密度等代理量选车, 而不改机器指派 [7]。把柔性指派与无冲突运输真正合在一起的工作相对较少: van Os 与 Basten [20] 形式化了带无冲突运输约束的柔性作业车间调度, 并以分解方法在多数基准算例上取得可证最优, 少数因限时未能保证最优性; 两阶段方案先固定排产再消解车辆冲突 [17]; 亦有学习层排产、路径层消冲突、并以有限反馈连接的框架 [9]。但这些工作回答的是开工前如何排出可行且质量好的无冲突排程。

据作者所知, 尚未见到同时纳入走廊预约表与执行期扰动响应的工作。这一句是有限度的: 本文不声称已穷尽文献, 因而不把它写成全称否定。可逐篇核对的事实是, 在本节所引的这些工作里两个条件没有同时出现——有预约表的把执行期故障排除在外, 处理执行期扰动的则没有预约表。以下两处依据的是原文中的建模假设(原句照录于表 1): Zhang 等 [24] 在建模假设中写明忽略 AGV 之间的碰撞; Sun 等 [17] 用时间窗 Dijkstra 消解车辆冲突, 却在假设中写明不考虑车辆的充电与故障、车辆始终可用, 并把设备维护与故障列为后续研究。

因此, 缺口不是某篇已有文献把边界画错了, 而是在上列工作中两个条件没有同时到位: 工序级划界成立, 往往因为没有走廊预约; 已有预约表的设定, 又把执行期扰动排除在外。一旦两者同时出现, 现成可沿用的只有按受影响工序划界的做法, 它对不改工序指派的走廊阻断会给出空范围(第 6.2 节实测 50/50)。本文要处理的就是这一情形。需说明的是, 该反例本身不依赖上述缺口陈述成立: 即便已有工作同时纳入了两个条件, 第 6.2 节的读数仍然成立, 受影响的只是本文的新颖性主张, 不是它的正确性。

上面的缺口判断与第 2.1 节的定位都建立在对他人工作的转述之上, 而转述可能失真。为使读者不取原文即可核对, 这些转述所本的原句列于表 1。列表的直接起因是其中一条没有通过核对: van Os 与 Basten [20] 的结论原先被本文转述为「以分解方法给出可证最优的基准」, 而原文限定为多数算例取得最优、少数因限时(time

表 1. 定位所依赖的转述与被引原文对照。列出本文据以划出缺口的五处转述, 每处给出被引工作的原句, 供读者不取原文即可判断转述是否忠实。第 4 行为一处已订正的转述: 原表述强于原文, 现已按原文收窄(见正文)。原文均为英文, 此处照录不译, 以免二次转述再引入偏差。

本文的转述	被引原文	原文位置
Zhang 等 [24] 的恢复范围取故障后尚未加工的工序	<i>"Rearrange the unprocessed operations of current scheme considering the limit of machine breakdown"</i>	重调度流程
Zhang 等 [24] 在建模假设中写明忽略 AGV 之间的碰撞	<i>"The collision of AGVs are ignored."</i>	建模假设第 (7) 条
Tang 等 [19] 按扰动影响把工序与配送任务分为保留、继续、重构	<i>"an event-driven partial rescheduling strategy is proposed, in which the disrupted operations and delivery tasks are classified into three categories: retained, continued, and reconstructed"</i>	摘要
van Os 与 Basten [20] 在多数基准算例上取得可证最优, 少数因限时未能保证最优性	<i>"For most benchmark instances, our LBBDD-based approach finds optimal makespan values. Because of time boxing, only in a few cases, the optimality of the found solution cannot be guaranteed."</i>	摘要
Sun 等 [17] 假定车辆始终可用、不考虑故障与充电, 并把设备维护与故障列为后续研究	<i>"It does not consider the charging problem and fault problem of the AGVs, and AGVs are always available"; "Breakdowns and charging problems are not taken into account."; "Future research will investigate the impact of equipment maintenance and breakdowns on production scheduling"</i>	假设列表、后续工作

表 2. 相关工作按划界对象分类: 每类工作把扰动后「需要改写什么」定义在哪种对象上。「边界划在」为重调度范围所依附的对象; 「有工序依赖图?」兼答该图是否与占用同图; 未行加粗者为本文所处的类别。

类别	代表工作	边界划在	有工序依赖图?	与本文的关系
作业车间局部重调度	AOR [1, 16]; match-up [2]; LRS [8]; 带 AGV 的动态调度 [19, 24]	工序 / 时间窗	有	后文对照复现按工序划界与右移
排他资源占用先后	alternative graph [12]; 铁路实时重调度 [4]	闭塞区段占用	有, 与占用在同一张图	让行关系同类; 铁路用它选择车辆的先后, 本文用既定先后划定需要改写的占用
无冲突多车路径	Online MAPF [11, 18]; LMAPF [25]	受影响车辆	无	集内改路、集外保持已是标准做法
带运输的柔性作业车间	常数矩阵 [5, 13, 15, 22]; 一体化排程 [9, 17, 20]	工序集合	有; 预约表与执行期扰动未同时出现	本文的位置

boxing) 未能保证最优性。这一偏差的方向值得记下——它替被引工作加强了结论, 而被加强的恰好是本文要对比的基线。

2.5 本文定位

综上, 在考虑 AGV 无冲突路由的柔性作业车间中, 排程同时用工序依赖刻画加工先后, 又用时间窗记录走廊占用。此时会出现前节所指缺口对应的情形: 走廊阻断等扰动并不使工序无法执行, 原指派仍然有效, 但与受扰时段重叠的走廊占用已经失效, 原排程不可行。后文按工序依赖图划界的对照, 复现的是第 2.1 节的做法。本文主张把重调度范围改到走廊占用及其让行、接续关系上, 得到由这些关系唯一确定的预约影响集。

3 走廊预约设定与执行期恢复问题

3.1 系统设定与记号

问题设定沿用带无冲突运输约束的柔性作业车间 [20]。本节一次写清后文用到的对象。一份可行排程 S^0 视为给定输入: 它在 $t = 0$ 如何被搜索出来, 不影响后文如何划定须改写的占用。

3.1.1 车间与四组决策. 车间路由图 $G = (V, E)$ 强连通。机械臂占据固定节点 $\text{loc}(m)$; $v_0 \in V$ 为装卸站。 n 个工件、机器集合 M 、同构单载车队 $K = \{1, \dots, N_A\}$ 。工件 j 有固定工序链 $O_{j1} \rightarrow \dots \rightarrow O_{jn_j}$; 工序 O_{ji} 的候选机器集为 $\Omega_{ji} \subseteq M$, 在机器 m 上耗时 t_{jim}^P 。一份完整排程同时确定四组决策: (i) 每道工序的机器指派 x ; (ii) 各机器上的工序扫描序 π ; (iii) 各次搬运的车辆指派 y ; (iv) 每次车辆移动在 G 上的无冲突路径。记

$$S = (x, \pi, y, R),$$

其中预约表 R 是第 (iv) 组的显式记录, 定义见下。

运输任务由指派派生, 不是输入: 仅当相邻两道工序不在同一节点时才产生一次搬运。一次搬运拆成两段——空载取货与满载送达——各段有自己的任务标签 u (例如 O_{ji} 的空载段与满载段是两条记录)。装卸取瞬时: 满载段在空载段抵达与工件就绪二者中较晚的时刻起行, 而送达时刻同时就是机器可开工、车辆可接新任务的时刻。后文允许改写哪些占用、哪些占用保持原计划, 以及如何改路, 都以段为粒度, 而不是整道工序。

3.1.2 走廊预约与无冲突. 每条走廊 $e \in E$ 是排他资源, 通行时间 τ_e 已知; 两个方向共享同一份占用, 因而任一时刻至多一辆车占用 e , 迎面冲突与同向超车一并排除。占用取半开区间: 第二辆车可以恰好在区间右端点进入。节点上设容量充裕的停靠位, 等待发生在节点上且总是被允许。一条预约记录为

$$r = (e, [t^s, t^e), k, u) \in R,$$

即车辆 k 在 $[t^s, t^e)$ 占用走廊 e , 所属运输段为 u 。同一走廊上任意两次不同占用必须满足 $[t^s, t^e) \cap [t^{s'}, t^{e'}) = \emptyset$ 。路径只写入 R 报告为空闲的时窗, 故无冲突是构造出来的, 不是事后修补的。

时间窗路由是后文改路与各对照方法共用的原语: 给定起终点、最早出发时刻与当前 R , 它返回一条与已有占用无交的通路及各走廊进入时刻。实现上采用时间窗 Dijkstra [17]; 本文不改这条原语, 只改哪些运输段被送进路由器。与 van Os 预约节点、Lyu 另加节点容量不同 [10, 20], 本文预约的是边; 第 7.1 节交代由此带来的算例口径限制。

3.1.3 工序依赖图与预约依赖图. 工序依赖图 $G_T = (T, E_T)$ (文献中亦称任务图, 下标 T 取自 task) 以工序为顶点, 边为工件先后与同机先后; 它不含走廊占用之间的让行关系。预约依赖图 $G_R = (R, E_R)$ 以 R 中的占用为顶点, 边为让行、同车、同工件与同机所诱导的依赖 (定义 4)。两张图的顶点集不相交: 一边是加工, 一边是通行。因此存在一类只改走廊时窗、不改任何工序参数的扰动——按 G_T 划界时找不到作为起点的工序, 而按 G_R 划界时起点占用非空, 且原排程已不可行。图 2 对照这两张图; 图 1 给出走廊阻断下的后果; 表 3 汇总本节及后文用到的记号。

3.2 执行期假设

执行期约定与物理设定如下。其中 A1–A4 由全部对照方法共用, 以便把读数归因到重调度范围如何划定, 而不是模型差异; A5 只约束本文方法, 全局重调度对照的允许动作更宽 (见该条末句):

A1. 初始排程可行. S^0 在扰动前通过无冲突校验; 预约表与工序时间表一致。

A2. 已完成占用不回溯. 只改写 $t_{\text{end}} > t_{\text{now}}$ 的尚未结束占用与未完工序; $t_{\text{end}} \leq t_{\text{now}}$ 的占用字段不可改写。

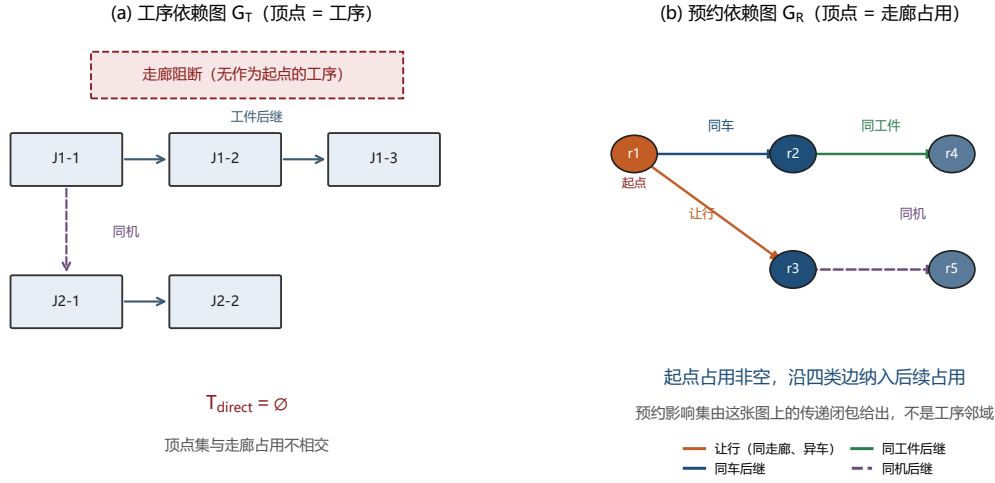


Fig. 2. 两张图的顶点集不相交(构造示意)。(a) 工序依赖图 G_T , 顶点是工序, 走廊阻断找不到作为起点的工序; (b) 预约依赖图 G_R , 顶点是走廊占用, 从与阻断窗重叠的占用出发, 沿四类依赖边 (让行、同车、同工件、同机; 定义 4) 纳入后续占用。

表 3. 本文常用记号

符号	含义
$G = (V, E), \tau_e$	走廊路网; 走廊 e 的通行时间
$v_0, \text{loc}(m)$	装卸站; 机械臂 m 所在节点
x, π, y	机器指派、扫描序、车辆指派
$R, r = (e, [t^s, t^e], k, u)$	预约表; 一条半开占用 (车辆 k , 段标签 u)
G_T / G_R	工序依赖图 / 预约依赖图
S^0, S'	扰动前排程、恢复后排程
$\mathcal{D}, t_{\text{now}}$	扰动事件、发生 (决策) 时刻
$T_{\text{direct}}, T_{\text{impact}}$	工序依赖图上直接受扰的工序 / θ -步纳入范围
$\text{Seeds}(\mathcal{D}), U$	作为起点的占用; 允许改写的占用集合
$\text{Cl}(\cdot)$	预约影响集 (STRC)
φ	受扰未来工序比例 (规模扫描)

- A3. 单次、完全观测。** 扰动在 t_{now} 被完整观测, 且不与其它扰动叠加; 扰动流、预测误差与滚动响应不在本文范围内。
- A4. 走廊排他、缓冲充裕、车队同构单载。** 走廊仍为排他半开资源, 阻断以附加占用 (或禁行窗) 注入路由层。有限缓冲、充电、加减速与装卸时长不建模; 全部车辆在计划开始时空载停于 v_0 。
- A5. 允许的恢复动作。** B 类扰动保持原机器指派 x 与扫描序 π , 只改路; 失败时扩大允许改写的占用集合。A 类故障额外允许: 车辆故障把故障车从车队摘除并换车; 机械臂故障把未完工工序改派到其它可行机。扫描序 π 始终不变, 不重开搜索。实验中的全局重调度对照可以改 x 与 π (第 5.3 节)。

3.3 扰动二分

定义 1 (A/B 类扰动). 若扰动直接使某些工序的指派或可执行性失效(机械臂故障、显著工时偏差、插单、车辆故障等), 称其为 **A 类**; 若扰动只使某些走廊时窗不可用、而不使任何工序不可执行(走廊阻断、走廊通行变慢等), 称其为 **B 类**。

注 1 (车辆故障为何属于 A 类). 车辆故障不改动任何工序的机器指派,乍看应与走廊阻断同类。但定义 1 的判断是可执行性而非指派: 一辆车抛锚后, 它承运的那些工序在原计划下无法开工, 故经「车辆→所承运工序」的映射, 工序依赖图上仍有作为起点的工序。这一归类把车辆故障划到按工序划界能够给出非空范围的一侧。只有当重调度方法维护了车-任务映射时, 这些起点工序才非空; 若方法只跟踪工序与机器 (AOR 的常见实现即如此), 车辆故障同样会得到空范围。本文不依赖这一点立论, 第 6.5 节按维护了该映射的强口径报告 A 类读数。

定义 2 (工序依赖图上的直接集与影响域). 对扰动 $\mathcal{D}$, 令 $T_{\text{direct}}(\mathcal{D})$ 为因机器故障、车辆故障或工序失效而无法按原计划执行的工序集合。对 B 类走廊扰动约定 $T_{\text{direct}} = \emptyset$ 。在 G_T 上从 T_{direct} 出发, 按工件后继与同机后继纳入深度至多 θ 的工序, 记为 $T_{\text{impact}}(\mathcal{D}, \theta)$ 。

定义 3 (作为起点的占用). 起点集 $\text{Seeds}(\mathcal{D}) \subseteq R$ 按扰动类型给出, 一律只取 $r.t^e > t_{\text{now}}$ 的占用。

- (a) **走廊阻断/降速** $\mathcal{D} = (e, [t_a, t_b]): \{r : r.e = e, [r.t^s, r.t^e) \cap [t_a, t_b] \neq \emptyset\}$ 。多处短暂阻断时取各窗起点占用之并。两者共用这条起点规则(原排程按时长未缩放的 τ 写出, 与窗重叠的占用都已失效), 故划定须改写的占用时二者给出同一个预约影响集——第 6.5 节据此说明为何不把二者的划界读数算作两次独立验证; 改路时二者已分开, 降速只缩放与窗重叠的那一段进度, 而不再写成整段禁行, 也不再把有交的穿越整段乘倍率。
- (b) **车辆故障** $\mathcal{D} = (k)$: 该车在 t_{now} 之后的全部占用 $\{r : r.k = k\}$ 。
- (c) **机械臂故障** $\mathcal{D} = (m, F)$, F 为该机上尚未完工的工序: 对每个工件取 F 中最小工序号 $i_{\min}(j)$, 起点占用为各工件自该工序起(含)的全部尚未结束占用。之所以沿工件链向后取而不只取该工序自身, 是因为进站运输可能已在 t_{now} 前结束, 若只取自身, 预约影响集会短于工序依赖图上的影响域, 对照即不公平。

命题 1 (B 类上工序依赖图给出空范围). 设 $\mathcal{D}$ 为走廊阻断。若采用定义 2 对 B 类的约定, 则 $T_{\text{direct}}(\mathcal{D}) = \emptyset$, 从而对任意有限 $\theta \geq 0$ 有 $T_{\text{impact}}(\mathcal{D}, \theta) = \emptyset$ 。若此外 $\text{Seeds}(\mathcal{D}) \neq \emptyset$, 则 S^0 在 $\mathcal{D}$ 下不可行。

证明. 走廊阻断只使走廊时窗不可用而不使任何工序不可执行, 故按定义 1 属 B 类。这一步用到两条前提: 阻断窗 $[t_a, t_b]$ 有限, 且由假设 A4 缓冲充裕, 车辆可在窗外通行; 因而即使阻断期内路网被割断, 也没有工序变得不可执行, 只是被推迟。若阻断无限期、或缓冲不足以支持等待, 该扰动按定义 1 就该归 A 类, 不在本命题范围内。既属 B 类, 再由定义 2 对 B 类的约定, $T_{\text{direct}} = \emptyset$ 。 θ -步纳入的起点为空, 故 $T_{\text{impact}} = \emptyset$ 。若存在 $r \in \text{Seeds}(\mathcal{D})$, 则 r 的占用区间与禁行窗相交。将 $\mathcal{D}$ 解释为该走廊上的强制占用后, r 与禁行窗在同一排他资源上时间重叠, 违背半开时窗无冲突条件(假设 A4 的走廊排他), 故 S^0 不可行。□

命题 1 是问题层面上的反例。前半句由定义 2 对 B 类的约定直接得到(工序依赖图按定义不含走廊占用之间的让行关系, 因而覆盖不到走廊阻断); 非平凡的是后半句——起点占用非空时原排程已经不可行, 因而「工序依赖图上范围为空白 $\Rightarrow$ 无需重调度」在用时间窗预约走廊的设定下不成立。该反例不依赖任何修复算法; 实验第 6 节给出算例规模。

3.4 恢复问题

问题 1 (按预约表划定范围的有界修复). 给定可行排程 S^0 、扰动 $\mathcal{D}$ 与时刻 t_{now} , 求 S' , 使得: (i) S' 在 $\mathcal{D}$ 下通过无冲突校验; (ii) 未纳入改写范围的占用, 其走廊、时段与车辆尽可能与 S^0 一致; (iii) 算法耗时受预算约束。次级目标为完工时间 $C_{\max}(S')$ 。

求解拆为两步:先划定允许改写的占用集合 $U \subseteq R$; 再只对 U 内运输改路,集外占用保持原计划。本文用 $\text{Cl}(\text{Seeds})$ 给出 U ; 对照则用工序依赖图上的影响域诱导出预约子集。

4 时空预约闭包

本节只产出允许改写的占用集合 U : 输入预约表 R 与起点占用集 $\text{Seeds}(\mathcal{D})$ (定义 3), 在占用之间建依赖图并取传递闭包, 输出 $U = \text{Cl}(\text{Seeds})$; 在 U 上如何改路属第 5 节。

4.1 预约依赖边

定义 4 (预约依赖图). 顶点为 R 中的走廊占用。有向边 $r \rightarrow r'$ 表示「 r 失效可能迫使 r' 改路」, 包括:

- (1) **让行边**: 同走廊、异车、时间重叠或半开区间接壤 ($r.t^e = r'.t^s$), 且先进入者指向后进入者; 接壤在排他语义下合法, 但前者延后则后者必须让路;
- (2) **同车后继**: 同一车辆按时间序相邻的两条占用;
- (3) **同工件后继**: 同一工件工序 i 的占用指向工序 $i+1$ 的占用;
- (4) **同机后继**: 同一机器时间轴上相邻两道工序所诱导的占用之间的边。

由此得到 $G_R = (R, E_R)$ 。四类边的示意图 2(b)。同工件后继连的是相邻工序所诱导的占用, 同机后继连的是同一机器时间轴上相邻两道工序所诱导的占用; 二者都以段为端点, 与第 3.1.1 节的粒度一致。四类边只回答一个问题: r 改写之后 r' 是否可能必须跟着改。它们不试图刻画全部物理耦合, 边集本身是建模选择, 其完备性由第 6.4 节的差分试探检验, 相应限定见第 4.2 节。

定义 5 (STRC). 对起点占用集 $S \subseteq R$ 、视界 H 与时刻 t_{now} , 记决策时刻尚未结束、且开始时刻早于视界的占用为

$$R^\circ = \{r \in R : r.t^e > t_{\text{now}}, r.t^s < H\},$$

并令 G_R° 为 G_R 在 R° 上的诱导子图。预约影响集 (时空预约闭包) 定义为

$$\text{Cl}(S) = \{v \in R^\circ : \exists s \in S \cap R^\circ \text{ 使 } s \rightarrow^* v \text{ 于 } G_R^\circ\},$$

即从尚未结束的起点占用出发, 沿出边可达的全部尚未结束的占用 (含起点自身)。本文全部实验取 $H = C_{\max}(S^0) + 1$, 此时 $r.t^s < H$ 对 S^0 中每条占用都成立、视界不起筛选作用, 保留 H 只为使定义可用于滚动视界。若以邻接表表示 G_R° (记其边集为 E_R°), 则可用队列在 $O(|R^\circ| + |E_R^\circ|)$ 时间内算出; 该界未单独计时, 划界只是第 6.9 节毫秒档读数的一个组成部分。

图 3 给出示意: (a) 阻断窗与作为起点的占用; (b) 依赖边与预约影响集的外壳——集外占用不是集内占用的出边后继 (命题 2)。

按工序依赖图划界的对照, 把 T_{impact} 映射为允许改写的占用: 凡任务标签属于该影响域且 $t^e > t_{\text{now}}$ 的占用。由命题 1, B 类上该集合为空。按预约影响集划界时取 $U = \text{Cl}(\text{Seeds})$ 。实验表中二者分别记为 R1 与 R2。

4.2 包含性

命题 2 (结构闭合性). 对任意 $S \subseteq R$, 在 G_R° 中不存在边 $u \rightarrow v$ 满足 $u \in \text{Cl}(S)$ 且 $v \in R^\circ \setminus \text{Cl}(S)$ 。因而, 从 $\text{Cl}(S)$ 出发沿出边无法到达影响集外、尚未结束的占用。

证明. 若存在这样的边 $u \rightarrow v$, 则由 $u \in \text{Cl}(S)$ 知存在尚未结束的起点占用 s 使 $s \rightarrow^* u$ 。拼接 $u \rightarrow v$ 得 $s \rightarrow^* v$, 故按定义 5 应有 $v \in \text{Cl}(S)$, 矛盾。□

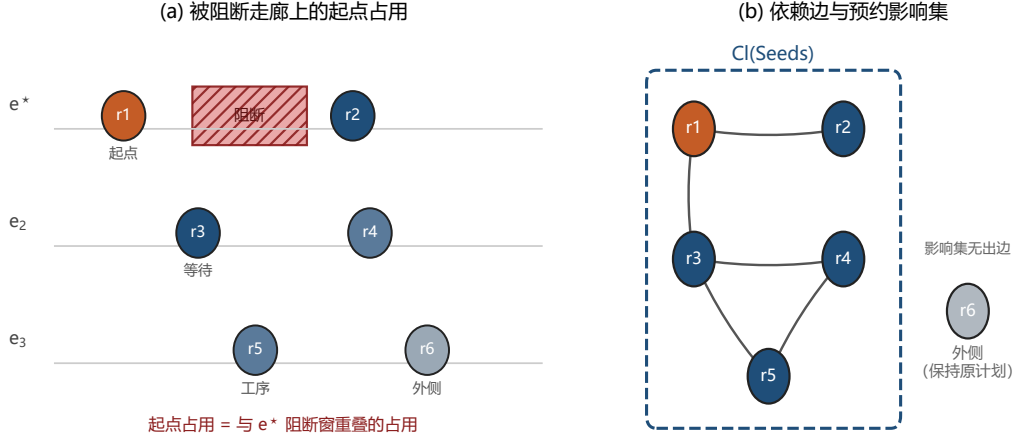


Fig. 3. 预约影响集的构造示意。(a) 与走廊阻断窗重叠的占用作为起点; (b) 沿四类依赖边(让行,以及同车、同工件、同机三类接续)取传递闭包得到 $CI(Seeds)$, 集外占用保持原计划。

命题 2 说明「局部」对应一个图论上闭合的对象:影响集外的占用不是任何集内占用的直接后继。这并不声称 G_R 已枚举物理世界中一切可能耦合——边集是建模选择;一旦边集固定,闭合性就是定义的推论,而不是启发式半径。

注 2 (预约影响集与最小允许改写集合). 结构闭合性说明影响集足够大:集内占用没有指向集外的依赖边。它并不说明影响集不过大。理由有三。

其一,最小允许改写集合依赖于所用的修复程序,而预约影响集不依赖。称集合 U 为最小,须指明「在何种修复能力下 U 足以恢复可行」。允许改派与改序时的最小 U , 与只允许改路时的最小 U 不是同一个集合。预约影响集由 G_R 唯一确定,与修复程序无关——因而在定义上不绑死某一启发式,也无法同时成为那种依赖修复程序的最小集。

其二,四类边在充分方向仍是过近似;必要方向上,已知的那条接壤通道已经补上。让行边按「同走廊、异车、重叠或接壤」建立,只要重叠即连边,而不判断后者是否真的只能靠等待前者通过——若该处另有旁路,后者改道即可,本不必纳入允许改写的集合;同车后继边同样可能把延误传不到的链尾一并纳入。这两处仍使影响集偏大。接壤一度是反方向的漏边:半开区间首尾相接合法,旧规则不连边,但前者延后则后者必须让路。现已并入让行边,差分试探在 50 对上泄漏为 $0(0/50)$; 第 7.1 节)。这只关闭了这一条已观测到的通道,不是边集完备的证明。

其三,实测上影响集并不小。第 6.5 节报告,走廊阻断下预约影响集平均覆盖 t_{now} 之后尚未结束占用的约 90%;换言之,相对「把决策时刻尚未结束的占用全部纳入改写」这一平凡上界,影响集少纳入的不足一成。有界修复真正省下的是不改写已经结束的占用与不重开搜索,而不是把未来切得很小。这一点在第 6.8 节与局限一节中再次点明,不应被「局部」「有界」这两个词读成「只动很小一块」。

「不足一成」是允许改写集合的规模之比,不等于改写比例之差。第 6.9 节把上述平凡上界作为一条独立对照(RA)实测后发现,正是这不足一成的差别,把改动比例从 0.604 降到 0.540(逐格 31/18/1, $p = 8.8 \times 10^{-7}$),而算法耗时与完工时间几乎不变。

因此,本文给出的是由结构唯一确定、可复现、足以恢复可行的允许改写集合,并附带闭合性;逼近最小允许改写集合是另一个问题,列为后续工作(第 7.2 节)。

命题 3 (外侧字段不变的充分条件). 设允许改写的占用集合 $U = \text{CI}(S)$, 并设第 1 级改路按第 5.1 节执行: (i) 禁行窗已写入路由层; (ii) 对每个 $r \in R^0 \setminus U$, 将其原字段 $(e, [t^s, t^e], k)$ 预提交到新预约表且预提交成功; (iii) 仅对 U 内运输调用路由器生成新占用; (iv) 最终排程通过无冲突校验。则在恢复后的预约表 R' 中, 每条 $r \in R^0 \setminus U$ 的走廊、时段与车辆与 S^0 一致。此处量词是逐占用而非逐任务: 一道运输可能一部分占用在 U 内、另一部分在外, 那时只有集外那部分受本命题保护。

证明. 由 (ii), 集外占用在重放开始前已按其原区间写入新表, 且未与禁行窗冲突 (否则预提交失败)。步骤 (iii) 只为 U 内任务提交新占用, 不删除或改写已提交的集外区间。因此, 对集外任务标签, 新表中的 $(e, [t^s, t^e], k)$ 与预提交值相同, 亦即与 S^0 相同。校验通过仅排除新占用与既有占用冲突, 不改变已提交字段。□

前提 (i)–(iv) 是第 5.1 节改路程序的执行条件, 可对算法逐条核验, 与 A1–A5 那种模型级假设不同类, 故不并入编号假设体系; 命题此外依赖 A1 (初始排程可行, 否则集外原字段之间就可能互相冲突、预提交必然失败)、A2 (已结束占用不回溯) 与 A4 (走廊排他)。

注 3 (前提 (ii) 与 (iii) 各自会怎样失效). 若预提交因「集外占用与禁行窗重叠」失败, 则 S 未能覆盖全部与阻断窗重叠的占用, 起点集不完备。若改路因运输–工序衔接失败而触发第 5.2 节扩大范围, 则新的允许改写集合 $U' \supsetneq U$, 命题 3 只对最终未纳入改写的集外占用成立。扩大范围以可行性优先于改写尽可能少, 实验中单独报告。还有一种失效不在命题的可控范围内, 但在实现上容易发生: 前提 (iii) 要求路由器只为 U 内的运输生成新占用。若实现以比占用更粗的单位 (例如整道运输、整个工序) 决定是否改路, 则 U 外的占用会被顺带改写, 命题的结论随之不成立——不是命题错了, 而是前提没被满足。注 4 记录了本文实现一度按整道运输改路的情形。

4.3 结构可预测性

预约影响集的规模不是可调参数, 而是由 G_R 唯一确定的量: 排程与路网一旦给定, 它就没有可调的半径。第 6.11 节把算例从 $8 \times 4 \times 4$ 放大到 $20 \times 10 \times 10$, 影响集占比在 0.48–0.56 间波动而不随规模恶化 (该比以全表为分母, 其可达上界约为 0.61; 以可改写集合为分母时为 0.78–0.91)。因而「局部」是可以测量的, 而不是人为设定的半径; 但它并不小, 见注 2。

至于哪种结构对应更大的影响集, 实验给出的是否定读数。本文先考察一类只由路网算出、不随当前排程变化的指标: 把装卸点与车间其余部分隔开所需切断的最少走廊数, 即装卸点最小割, 连同漏斗占比; 下文把这一族称作静态割。影响集规模不由静态割决定。在自建的同规模布局上, 不同边界阻断协议下的相对规模或落在很窄的带内、或虽有方向但各随机种子上的取值高度重叠; 换用一批不由本文设计的路网后, 装卸点最小割与漏斗占比取值恒定, 而影响集占比在同一张路网上换三种机器配置 (6、7、8 机) 时即大幅移动——一个恒定的量不可能解释一个变动的量 (第 6.7 节)。这条否定只针对「静态割能解释影响集规模」这一命题, 并不等于「结构与影响集规模无关」。可得的可公开路网数量有限, 后者尚不可判。下一个候选刻画应是随排程而变的量, 而非纯拓扑量 (第 7.2 节)。

5 预约影响集上的有界修复

图 4 总览本节流程: 先按预约影响集划定允许改写的占用集合 U , 再只对集内运输改路、集外保持原计划; 仍不可行则扩大 U 再试。按工序依赖图划界的对照只替换 U 的来源; 全局重调度对照则在限定时间内重新搜索。各方法共用同一套走廊路网、时间窗路由与无冲突校验。

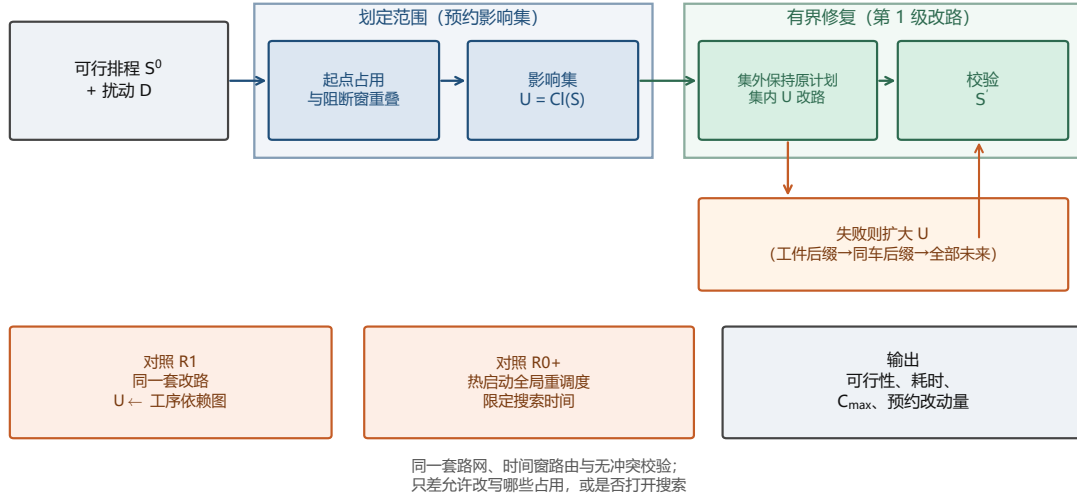


Fig. 4. 按预约影响集划界的有界修复。上排:由起点占用得到影响集并改路;中排:失败后扩大允许改写的范围;下排:按工序依赖图划界的对照与热启动全局重调度对照,以及输出指标。本图只画方法层的三条路径;毫秒档内另有三条对照(第 6.9 节)。

5.1 允许改写、保持原计划与第 1 级改路

给定允许改写的占用集合 U , 第 1 级改路保持原车辆指派与机器指派, 按原扫描序重放。改路按走廊腿切分: 车在 t_{now} 已走完的腿属历史, 原样预提交, 改路只从它当时所在的节点接着走; 粒度粗于腿即会改写历史(注 4)。算法 1 写出这一原语; 算法 2 在它外面套预约影响集, 失败则扩大 U 。

划界那一遍广度优先(定义 5)只占耗时的一小部分: 一次 `REPLAYREROUTE` 还要对 $|U|$ 个运输段各调用一次时间窗最短路, 实测耗时由后者主导(第 6.4、6.9 节)。该级不开种群搜索。第 6.4 节的对照固定算法 1, 只替换 U 来自工序依赖图或预约影响集, 用以把可行率之差归因于划界对象。

5.2 失败后扩大允许改写的范围

扩大允许改写的范围, 本身已有成例。Local Rescheduling [8] 按时间窗逐步放宽直至可行; AOR 则按工件后继与同机后继纳入后续工序(第 2.1 节)。本文沿预约依赖边扩大 U , 而不是沿时间窗。这些步骤用来落实影响集: 改路失败时仍先扩大须改写的占用, 而不是立刻改开全局搜索。第 6.1 节说明边界消融实验为何必须关闭这一步。

当集外占用保持过紧时, 算法 1 可能因运输-工序衔接等校验失败。此时按下列顺序扩大 U 并重试同一套改路程序: (i) $U \leftarrow U \cup \{\text{当前 } U \text{ 内各工序的同工件后缀、尚未结束的占用}\}$; (ii) $U \leftarrow U \cup \{\text{所涉车辆的同车后缀、尚未结束的占用}\}$; (iii) $U \leftarrow \{r \in R : r.t^e > t_{\text{now}}\}$ (把决策时刻尚未结束的占用全部纳入改写)。扩大范围后仍是确定性的单遍改路。实验表明这一步可将可行率拉至全样本, 算法耗时仍保持在毫秒至十余毫秒量级(第 6 节)。这一步使耗时不随扰动比例 φ 单调变化, 因为两种效应方向相反: 比例小时初始影响集偏紧、更常需要扩大范围, 比例大时初始 U 已较松、往往一轮成功, 但单轮要改路的运输更多(读数见第 6.10 节)。

5.3 与全局重调度的对照

全局重调度对照在相同禁行约束下、在限定时间内以原排程为起点重新搜索(记 $R0+$)。内部把 (x, π) 编成一条染色体; 一次解码指: 按该染色体的指派与扫描序, 在装了禁行窗的预约表上从头为全部运输调用第 3.1.2 节的时

算法 1 第 1 级改路重放 REPLAYREROUTE**Require:** 排程 $S^0 = (x, \pi, y, R)$, 扰动 $\mathcal{D}$, 允许改写集合 U , 时刻 t_{now} **Ensure:** 排程 S' 或失败

```

1: 将  $\mathcal{D}$  写入路由层                                ▶ 阻断:禁行窗;通行变慢:重叠段  $\tau$ 
2: 取空表  $R'$ 
3: for 每条不可改写的占用:集外的全部,以及  $r \in U$  而  $r.t^e \leq t_{\text{now}}$  的 do
4:   将原字段  $(e, [t^s, t^e], k)$  预提交到  $R'$                 ▶ 第二类是 A2 的历史,漏掉即等于改写历史
5:   if 与阻断窗冲突 then
6:     return 失败                                ▶ 起点占用未覆盖与窗重叠的占用
7:   end if
8: end for
9: for 每条  $r \in U$ ,按原扫描序 do
10:  从该车在  $t_{\text{now}}$  的节点接起                                ▶ 已走完的腿上一步已占位,不重复提交
11:  在当前  $R'$  上调用时间窗路由,提交新占用                ▶ 不改写已经结束的占用
12: end for
13: 按  $\pi$  推进各机器空闲时刻与各工件就绪时刻
14: 独立校验:无冲突、无禁行窗残留、通行变慢的重叠段时长已吸收、集外字段未改
15: if 校验通过 then
16:   return  $S' = (x, \pi, y, R')$ 
17: else
18:   return 失败
19: end if

```

间窗路由,得到新的 R 与 C_{max} 。R0+ 重复解码并允许改染色体;第 6.9 节的 RD 只解码一次且不改染色体。R0+ 的解码不改写已经结束的占用:这些占用预提交,只从 t_{now} 接着排未开始的工序(第 6.8 节)。对照取热启动而非从零搜索,以免丢掉原排程已有的指派与路径信息。R0+ 可改派与改序,因而更可能缩短 C_{max} ,但算法耗时由预算决定。

有界修复在完工时间上并不优于 R0+。第 6.8 节表明:R0+ 在最小预算档上已占优,而 R2 是定点、R0+ 随预算单调不增,故加预算也不出现反超。有界修复的长处是算法耗时:响应须在毫秒量级时,它能恢复可行;允许秒级停机时,应用 R0+ 去缩短 C_{max} 。集外占用的走廊、时段与车辆保持原计划,只在命题 3 的条件下保证,实验中作部分观测。

只与 R0+ 对照会留下一个问题:毫秒量级那一档里,是否根本不需要按影响集划界?把「不影响集限制范围」的做法直接实现出来即可回答,本文取三种:全局右移(RS)不判断哪些占用受影响,只把未完成占用整体后推到阻断结束之后;原染色体重解码(RD)不改染色体,只走一遍固定前缀解码;RA 把 t_{now} 之后尚未结束的占用全部纳入改写,再走与第 5.1 节完全相同的改路程序,因而与本文方法只差「允许改写哪些占用」这一项——它是唯一能把预约影响集单独隔离出来的对照。三者都在毫秒量级,构成有界修复在同一耗时档位内的对照,定义与读数见第 6.9 节。

算法 2 把本节与上节合起来写出,与图 4 对应。

6 实验

6.1 协议

路网、路由与算例. 下层路网、时间窗路由与独立校验器固定。扩样矩阵使用五个算例: 小例 example_3x3x2、拥堵例 congested_8x4x4, 以及三个 S8x4x4 布局 high、funnel 与 mid。后三者同规模、同柔性,只差走廊拓扑,因此它们之间预约影响集规模的差异可归因于拓扑而非问题尺寸。五者分两种来源:前两个是手写布局(小例供逐

算法 2 基于预约影响集的有界修复(第 1 级改路 + 扩大范围)

Require: 排程 S^0 , 扰动 $\mathcal{D}$, 时刻 t_{now}
Ensure: 排程 S' 或失败

 1: $S \leftarrow \text{Seeds}(\mathcal{D}); U \leftarrow \text{Cl}(S)$

 2: **for** 轮次 = 0, 1, 2, 3 **do**

 3: $S' \leftarrow \text{REPLAYREROUTE}(S^0, \mathcal{D}, U, t_{\text{now}})$

 4: **if** S' 可行 **then**

 5: **return** S'

 6: **end if**

 7: 按扩大范围的规则更新 U

▶ 工件后缀 / 同车 / 全部尚未结束

 8: **end for**

 9: **return** 失败

步核对,拥堵例为哑铃拓扑);后三个由本文的算例生成器产生,其参数——工件数 $\times$ 机器数 $\times$ AGV 数、拥堵档、 H 、 F ——与生成随机种子一并编码在算例文件名中,三者的生成随机种子同为 42。生成随机种子与下文的运行随机种子是两回事:前者只决定算例本身,后者决定扰动注入与搜索过程;两者在取值上都出现 42 纯属巧合,不存在共用。随机种子取十个,即 42、7、2024、99、123、13、1、777、31415 与 8,共 $5 \times 10 = 50$ 个算例-随机种子对。全文所有逐格比较、胜负计数与配对检验都按(算例,随机种子)这一对键对齐:同一键下各方法读取同一份初始解、同一段阻断与同一决策时刻。初始排程由第 3.1.2 节的时间窗路由按扫描序重放得到,并通过独立无冲突校验;同一算例-随机种子对下各对照方法共享该初始解。本文不依赖这份 S^0 的搜索来源,只要求它在扰动前可行。

实现与运行环境. 全部实验为纯 Python 标准库实现,不依赖第三方数值库;下层路网、时间窗路由与独立校验器复用与静态一体化工作同一份实现。单机单线程运行,不使用并行: Intel Xeon W-1270 (8 核 16 线程)、64 GB 内存、Windows 10,解释器为 CPython 3.7.6(64 位)。因不引入第三方数值库,复现不需要锁定依赖版本;3.7 是本文实测的解释器,更高版本未逐一复跑。所有计时读数都在上述单机单线程条件下取得,换机器会整体平移,故本文一切耗时结论都以比值或量级形式给出,不用绝对毫秒立论。

代码与数据可用性. 复现所需材料分三部分:上层有界修复与实验驱动、下层路网与时间窗路由、算例与扰动输入及全部逐格读数(CSV)。三者连同重跑各表各图的脚本一并提交,审稿期间以匿名仓库形式提供(见投稿系统所附链接,仓库内不含作者身份信息);论文接受后转为公开仓库并在永久存档服务上登记 DOI,本节届时补填该 DOI。每张表与每幅图在仓库中都能追到生成它的脚本与对应的 CSV,表 13 所列算例亦随仓库分发。

第二批:布局出处外部化. 上面五个算例的布局都是本文设计的,其中三张同规模布局还同属哑铃一族(彼此只差装卸点出口与中段的并行通道数,即只差容量、不差几何)。为了让布局不再由本文决定,另跑一批 5 个算例:路网的网格尺寸、装卸站与机器落位、断掉的边这三项逐项转录自 Lyu 等 [10] 附录 A 的布局图,转录结果由脚本与 van Os 配套工具集所给的机读编码逐字段对账。机器台数因此由布局决定而非由本文选定,为 4 至 8 台。随机种子仍取同样十个,合计 50 个算例-随机种子对。两批算例逐参数同口径:工件数、AGV 数、每工件工序数、 H 、 F 以及运输/加工时长比的标定目标一律相同,于是两批之差可以干净地归因给布局出处。

该附录共给出六张布局(3 至 8 机)。3 机那张未用:固定 $F = 0.6$ 在 $|M| = 3$ 时给出平均候选机数 $1.8 < 2$,与「每道工序至少两台候选机」不相容,而为一张布局放宽 F 会多引入一个变量。

其余五张只落在 2 张不同路网上,须先说明:4 机与 5 机两张共用同一张 4×4 网格(去掉同一条边),6、7、8 机三张共用同一张 5×5 网格(去掉同两条边);五者彼此的差别在于机器台数与落位,而非路网几何。这是原始发布件本身的组织方式,不是本文的取舍。因此第 6.7 节读这批数时,路网几何这一维的独立样本是 2 而不是 5,而机器落位这一维有 5 个;下文的论断严格按这个划分来下。

有三处口径必须先声明清楚。其一,逐段行驶时间不是原始数据。Lyu 只为单个示例算例发表过逐段时长,且其取值并不均匀;附录 A 那批布局的逐段时长从未发表。故这里按「所有边等权」补齐——它与 van Os 模型里「单步时长为常量」的假设在结构上一致,只是时间单位的标度不同。因此本批结果不可与 Lyu 或 van Os 的参照值作任何比较;它提供的只是一批不由本文设计的拓扑,而不是一个对标集。其二,装卸点做了合并。原布局有分离的装货站与卸货站,本文只有一个装卸点,故取车辆起始处的装货站充当该点,卸货站退化为普通网格节点。其三,工件数据没有一并借用。已实测的公开族里平均运输时长只占平均加工时长的百分之几,运输在其上几乎不构成争用;若把工件数据也搬进来,走廊争用连同以它为对象的整套结论都会退化到观察不到。外部化的只有路网。同一工具集另附的一族布局(其目录标注为 Liu 2023)未纳入本批:这些布局的数据声明允许对角移动,而本文的走廊是四邻接的;接受对角移动要改的是下层路由而不是算例。

扰动。除非另注, $t_{\text{now}} = 0.35 C_{\text{max}}(S^0)$ 。E1-E3/E5 在繁忙走廊上施加单窗阻断;E6 在同一 t_{now} 上另加三类扰动;规模扫描将未来工序按最早未来预约排序,取前比例 φ 的预约时窗作为微阻断(不合并)。

对照方法。R1:按工序依赖图上的影响域划界 + 第 1 级改路,全文取 $\theta = 2$ (该值只影响 A 类扰动下 $|U_{R1}|$ 的大小;由命题 1,B 类上任何有限 θ 都给出空集);其划界规则取自第 2.1 节所述的工序级局部重调度做法,由本文重新实现。逐条对应关系是:「受影响工序集取直接受扰工序,再沿工件内工序先后关系向后扩张」这一条划界规则对应 AOR [1, 16];而以跳数 θ 截断扩张、以及把工序集映射为须释放的走廊预约两项由本文写定——原文的设定里没有预约表,这一映射在原文中无对应物;改路与重放部件则与 R2 共用同一份实现,以保证两者只差划界对象。因此 R1 是「把该划界规则移到本文预约设定下」所得的对照,不是对上述文献的复现;第 6.4 节它的读数只说明该划界规则在此设定下给出空范围,不构成对原方法在其自身设定下的评价;R2/STRC:按预约影响集划界 + 第 1 级改路(规模扫描打开失败后扩大范围;E3/E5 关闭这一步);R0+:以原排程为起点、在限定时间内重新搜索的全局重调度——遗传算法,种群 40,原排程对应的染色体置入初始种群,解码走与 RD 同一套固定前缀解码(t_{now} 之前的占用不可改写);不设代数上限与早停阈值,终止条件只有挂钟预算一项,预算取值见第 6.8 节;RS:全局右移,不按影响集划界且不改路(第 6.9 节);RD:原染色体重解码,即本实现里耗时更短的一次全局重算(同节);RA:不按影响集限制范围、但保留改路——把 t_{now} 之后尚未结束的占用全部纳入改写,其余与 R2 逐项相同,用于把预约影响集这一项单独隔离出来(同节)。这五条对照按「是否划界 $\times$ 重算多少」铺开:R1 与 R2 只差划界对象,RA 与 R2 只差是否划界(改路程序完全相同),RS 既不划界又放弃改路而整体后推,RD 与 R0+ 则重算全局而不按影响集划界,只差搜索多少代。

预算口径。各法不在同一预算档上比较,这一点须先说明:R1、R2、RS、RD、RA 均为一次确定性修复,跑完即止,耗时由算例规模与影响集大小决定而非由预算设定;只有 R0+ 按挂钟预算终止。因此 R0+ 与其余各法之间不存在同挂钟、同代数或同评价次数的对齐,凡涉及 R0+ 的读数一律按「给定预算下的读数」理解;第 6.9 节的四法对照才是同一预算档内(均跑完即止)的比较。挂钟耗时按批次报告,不跨批次并读。

一处必须写清的口径。E3 中必须关闭失败后扩大范围。若开着,R1 会靠「一路扩到把尚未结束的占用全部纳入改写」而偶然成功,测到的就不再是划界对象的差别,而是扩大规则的兜底能力。扩大范围本身有效(规模扫描中它把可行率拉满),但它与被测变量正交,故在边界消融中一律关闭。该端点并未因此被回避:它就是第 6.9 节的 RA,那里作为独立对照逐格测了它的代价。

两批算例各自承担什么。两批不是同一组证据的两次采样,它们回答的问题不同,故本章各节只由其中一批支撑。主批次回答现象是否存在、机制是否干净:B 类扰动下按工序依赖图划界得到空范围而原排程不可行(第 6.2 节)、预约影响集对该范围的包含与集外字段的不变性(第 6.3 节)、同一套改路程序下只替换划界对象的对照(第 6.4 节)。这三件事都要求对算例参数有完全的控制权,尤其是运输/加工时长比——它决定走廊争用是否成立——而公开族给不了这种控制权(第 7.1 节局限第 4 条)。第二批回答的是另一个问题:这些现象是否只在本文自选的布局上成立。它因此只用于复现,不产生新的性能读数(第 6.12 节)。

表 4. E1 走廊阻断下工序依赖图给出空范围(每算例 10 个随机种子,共 50 对)。|R| 为全表占用数,CI/|R| 为预约影响集占全表的比例。均值取多个随机种子的平均。离散度按四分位距(IQR)报告:逐算例 CI/|R| 的 IQR 在 0.024–0.049 之间,50 对合池的中位为 0.571、极差 0.500–0.655;可见该比例的算例间差异与随机种子间差异同量级,不宜只读均值。「C1 通过」为命题 1 三条件同时成立的格数($T_{\text{impact}} = 0$ 、起点占用非空、阻断后原排程不可行)。后三行同规模同柔性,只差走廊拓扑。

算例	随机种子	C1 通过	均 R	均 Seeds	均 CI	CI/ R
example_3x3x2	10	10/10	28.6	5.6	16.9	0.59
congested_8x4x4	10	10/10	85.0	15.0	48.4	0.57
S8x4x4 (high)	10	10/10	150.5	15.5	88.3	0.59
S8x4x4 (funnel)	10	10/10	149.1	15.5	85.4	0.57
S8x4x4 (mid)	10	10/10	147.6	15.0	82.8	0.56
合计	50	50/50	—	—	—	—

两处需要点明。其一,第二批用来检验现象是否只在本文自选布局上成立,并收窄结构可预测性的结论(第 6.7 节)。其二,只有 E4 一格必须两批合读:主批次的三张同规模布局同属一族、几何差异很小,在它们身上「指标太粗」与「算例集几何差异不足」这两种解释混在一起;而外部布局若没有逐参数同口径的自建对照,也无从判断其影响集占比的变动幅度是否足够大。其余各节的结论由主批次单独成立,第二批只增强其外部效度。

统计口径. 全文只有一处推断性检验:第 6.9 节 R2 与 RA 在改动比例上的差,采用 Wilcoxon 符号秩检验,双侧,按上述(算例,随机种子)键配对。因为全文只做这一次检验,不构成多重比较,故未做校正;其余各处的逐格胜负、均值与中位一律是描述性统计,不作显著性断言。该检验配套的效应量报为 Hodges–Lehmann 估计 0.037,95% 自助置信区间 [0.018, 0.074](百分位法, 10^4 次重采样,固定随机种子);配对差的均值为 0.064,区间 [0.039, 0.093]。离散度按四分位距报告:改动比例在 R2 上为 0.073、在 RA 上为 0.062。中位的区间下端触 0——这一点如实记下,它说明胜负计数里的持平格占了三分之一。其余各批次的表格只给均值、中位与计数,不含区间。

6.2 E1:工序依赖图给出空范围

本节只问一件事:B 类扰动下两种划界各给出什么范围,不比较修复质量。表 4 与图 5(左)按第 6.1 节的走廊阻断协议汇总命题 1 的扩样结果:50/50 样本上 $T_{\text{impact}} = 0$ 、起点占用与预约影响集非空、阻断后原排程不可行。

按命题 1 之后那段话的提醒,读这张表时重量应压在后半句上。表 4 把三个条件折进「C1 通过」一列合并计数,而三者的性质并不相同,故须拆开读;逐格读数见数据文件 e1_miss.csv 的 n_T_impact 与 feasible_after_block 两列。其中 $T_{\text{impact}} = 0$ 是定义 2 对 B 类约定的推论,它把「工序依赖图按定义覆盖不到走廊阻断」显示出来,但本身不是发现。非平凡的是后一列恒为假——排程确实已经不可行。两者合起来才构成反例。

|CI| 的绝对值随算例变大(16.9、48.4、82.8–88.3),这是占用总数变多的直接结果;而 CI/|R| 在五个算例上都落在 0.56–0.59,未能区分三个 S8x4x4 布局。这与第 6.7 节的结论一致:实验没有给出能可靠预测影响集规模的结构指标。就贡献而言,本节只坐实一件事:B 类扰动下按工序依赖图划界得到空范围,而原排程确已不可行;CI/|R| 的具体数值不承担任何主张。

6.3 E2:包含性

结构包含性(E2a)在 50/50 样本上成立(泄漏 = 0),与命题 2 一致。第 1 级修复(不扩大范围)在 50/50 样本上可行。集外占用的走廊、时段与车辆逐条不变(E2b / 命题 3 的观测形式)同样在 50/50 样本上成立(表 5)。

需要区分 E2a 与 E2b 说的不是一回事,满通过并不使命题 3 升格为充要。E2a 是图上的性质,由命题 2 保证,满通过是应当的;若不满通过,说明实现与定义不符。E2b 是修复之后的性质,它检验的是命题的四条前提在本文协议下是否成立——而不是这些前提可以省略。特别地,前提 (ii) 要求集外占用逐条预提交成功;若某条集外占用与禁行窗重叠,预提交即失败,那说明起点占用集不完备(注 3),此时命题不适用。本文的实验落在前提成立的一

表 5. E2 包含性(10 个随机种子/算例;第 1 级可行一列不扩大范围)。E2a 为结构闭合(泄漏 = 0), E2b 为集外占用的走廊、时段与车辆逐条不变。

算例	E2a 闭合	第 1 级可行	E2b 集外逐条不变
example_3x3x2	10/10	10/10	10/10
congested_8x4x4	10/10	10/10	10/10
S8x4x4 (high)	10/10	10/10	10/10
S8x4x4 (funnel)	10/10	10/10	10/10
S8x4x4 (mid)	10/10	10/10	10/10
合计	50/50	50/50	50/50

侧, 不等于任何设定下都会落在那一侧。收口到贡献:E1、E2 与第 6.4 节的边界消融支撑的是对象成立这一层——预约影响集由边集唯一确定、对外封闭,且在同一套改路程序下足以恢复可行;按这个对象划界比不划界多出多少收益是另一层,只由第 6.9 节的 RA 对照支撑。

注 4 (一处曾经把实现缺陷读成边集缺陷的教训)。这一栏在早前的批次上只有 24/50。当时的解读是「依赖边集未能覆盖若干弱耦合」,并据此把加细边集列为首要后续工作。复核后该解读是错的。允许改写的是一个占用集合,而重放时是否改路却按工序判定——同一工序的空载段与满载段只要有一段落在影响集内,整道运输就被重规划。于是当只有满载段进入影响集时,同工序的空载段也被改写,而它的任务标签并不在允许改写的集合内,遂被记为集外漂移。26 个不通过格上的 84 条漂移占用无一例外都是这种同工序空载段,其中 71 条(85%)在 t_{now} 之前就已执行完毕——改写它同时违反「不改写已经结束的占用」。改为按段判定(已执行完或未纳入改写的空载段沿用原计划,只改路真正落在允许改写集合内的段)之后,漂移归零。换言之,此前测到的不是边集对物理耦合的覆盖度,而是命题 3 前提 (iii)「仅对 U 内运输调用路由器」在实现上没有被真正满足。记下这一条,是因为它示范了一种容易发生的误判:把实现与定义的粒度错配,读成模型对世界的刻画不足。

同一类错配还剩一层,而 E2b 查不到它。按段判定之后,一个跨越 t_{now} 的运输段仍是整段重规划:只要它有一条走廊腿的结束时刻落在 t_{now} 之后,整个段的任务标签就进入允许改写的集合,于是它在 t_{now} 之前已经走完的那几条腿也被重排——等于把车退回该段起点重走一遍,违反「不改写已经结束的占用」。E2b 查不出这一情形,因为这些腿的任务标签在影响集内,本就不在集外字段的比对范围里。用一项独立的「已结束占用不可改写」审计(逐条比对 $t_{\text{end}} \leq t_{\text{now}}$ 的占用)才测出来:50 个格子里有 36 个存在此类改写,合计 86 条。把粒度再细一层——按走廊腿切分,已走完的腿原样保留,改路只从车在 t_{now} 时实际所处的节点往后接——之后该审计在全部 50 个格子上归零,且各项通过率不变、 C_{max} 在 6 个格子上变好、无一格变差。本文报告的是修正后的读数。本注的历史读数(24/50、26 格 84 条、36 格 86 条)来自修正前的批次与一次独立的「已结束占用不可改写」审计,不在本文任何表中,也不参与任何主张。

6.4 E3:边界消融

表 6 与图 5(右)固定第 1 级改路并关闭失败后扩大范围。B 类上 50/50 样本 R1 的允许改写集合为空且不可行,R2 全部可行。

这是本文最强的一组对照,但它的说服力来自只差一项而不是来自数字大:同一套改路程序、同一份初始解、同一个 t_{now} 、同一批随机种子、同一段阻断窗,唯一的差别是允许改写哪些占用。因此 0/50 对 50/50 这个反差不能归因于改路启发式的优劣——R1 侧根本没有触发任何改路,它的允许改写集合是空的,第 1 级改路对空集是恒等操作,于是原排程原封不动地留在被阻断的走廊上。换句话说,R1 的失败方式不是「修得不好」,而是「判断为无需修」。第 1 级改路逐格的耗时中位数为 3.2 ms、最大 12.8 ms;表 6 末列是各算例内 10 个随机种子的均

表 6. E3 边界消融(不扩大范围;5 算例 $\times$ 10 个随机种子)。miss_B 指该格上 R1 的允许改写集合为空而 R2 非空。未列为各算例内 10 个随机种子的均值,与正文逐格中位数口径不同。

算例	miss_B	R1 可行	R2 可行	均 $ U_{R2} $	R2 耗时/ms
example_3x3x2	10/10	0/10	10/10	16.9	0.66
congested_8x4x4	10/10	0/10	10/10	48.4	2.84
S8x4x4 (high)	10/10	0/10	10/10	88.3	3.40
S8x4x4 (funnel)	10/10	0/10	10/10	85.4	5.09
S8x4x4 (mid)	10/10	0/10	10/10	82.8	3.96
合计	50/50	0/50	50/50	—	—

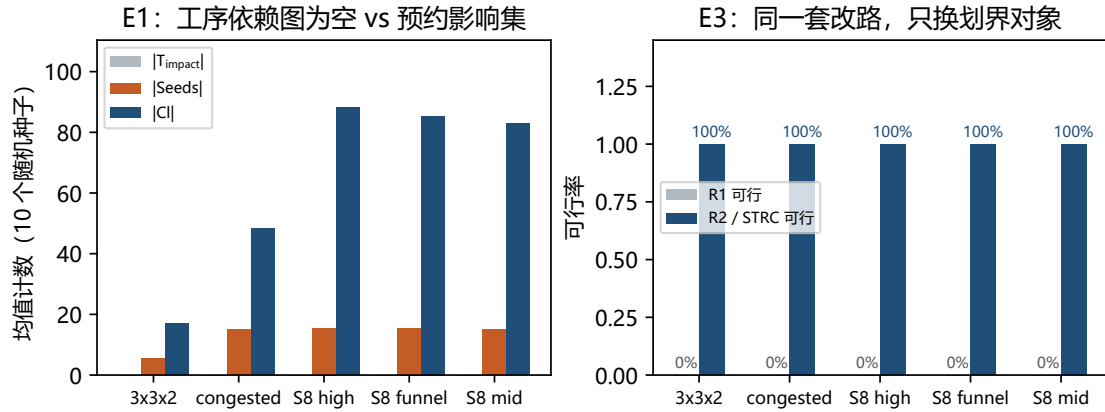


Fig. 5. E1/E3 扩样可视化(5 算例 $\times$ 10 个随机种子均值)。左:工序依赖图上的影响域为空,而起点占用与预约影响集非空;柱高为每算例 10 格的均值,离散度按四分位距见表 4(|CI| 的 IQR 逐算例在 2-8 之间,影响域一组恒为零故无离散度)。右:同一套改路、只换划界对象时 R1 可行率为 0、R2 为 100%;该幅为逐格计数(各 50 格),不是均值,故不配离散度。

值,两者口径不同,不可对读。就贡献而言,本节把缺口的成因定在划界对象上:同一套改路程序只换划界对象,恢复可行率即从 0/50 变到 50/50;这仍属对象成立那一层,不涉及划界的净收益。

上述反差是否依赖边权标定,另作检验。本文的走廊边权取等权,故按三档非均匀边权 (lognormal、lu_far、split;数据见 weight_sweep.csv) 在同一批 50 对上重跑 E1 与 E3:C1 通过与工序依赖图范围为空的读数逐档不变, R1 仍全格不可行,R2 第 1 级的可行格数依次为 50/50、50/50、49/50,唯一不可行的一格出现在 split 档(S8x4x4_high,随机种子 1)。故该反差并不依赖等权这一标定;但自建边权的扫描仍不能代替一份同时发布路网与逐段时长的算例族(第 7.1 节局限 4)。

6.5 E6:扰动类型与边界定义的交叉

E1-E3 只用了走廊阻断一种扰动。本小节把扰动类型这一维展开,在同一 50 对上另加走廊通行变慢、车辆故障与机械臂故障三类,给出表 7。

先说测什么。划界一侧四类都报:工序依赖图上的影响域有多大、预约影响集有多大、后者是否包含前者。修复一侧四类都开口。B 类仍只改路:阻断把禁行窗写入预约表,通行变慢在窗内按倍率 $\tau_{\text{mult}} = 2$ 降低进度、窗外仍走原 τ ,走廊仍可走。A 类额外换车或改派,不改扫描序;是否扩大允许改写的范围,对它们不改变动作集合。

表 7. E6 扰动类型 $\times$ 划界对象(50 对/类,共 200 次测量; 其中两类 B 扰动按构造给出同一起点集,故独立划界测量为 150 次,见正文第三点)。 $|R^\circ|$ 为 t_{now} 之后尚未结束的占用数。「R1 为空」即按工序依赖图划界判该扰动无需重调度的格数。未列不扩大范围:B 类为第 1 级改路,A 类为换车或改派。

扰动	类	R1 为空	均 $ U_{R1} $	均 $ C $	$C / R^\circ $	R2 可行
走廊阻断	B	50/50	0.0	64.4	0.92	50/50
走廊通行变慢	B	50/50	0.0	64.4	0.92	50/50
车辆故障	A	0/50	31.1	60.6	0.85	50/50
机械臂故障	A	0/50	42.8	65.9	0.94	50/50

四点读数。第一,A/B 二分在 150 次独立划界测量上无一例外(两类 B 扰动按构造共用同一起点集,见下面第三点,故不计作 200 次);两类 B 扰动按工序依赖图划界全部为空,两类 A 扰动全部非空。第二,在全部 100 次 A 类测量上 $U_{R1} \subseteq C|$ ——这说明改用预约影响集划界在 A 类上不会丢掉 工序依赖图已纳入的占用。包含在 87/100 上是严格的,其余 13 格两者恰好相等(此时影响集沿依赖边没有走出工序依赖图影响域诱导的那个集合),不是包含失败。其中机械臂故障那 50 格的包含按构造成立:定义 3(c) 的起点规则沿工件链取整条后缀,而 U_{R1} 以 $\theta = 2$ 截断(第 6.1 节),故该行验证的是实现与定义一致,不是一项独立发现;车辆故障那 50 格的包含不由构造给出,是实测结果。代价是允许改写的集合平均变大:车辆故障 $31.1 \rightarrow 60.6$,机械臂故障 $42.8 \rightarrow 65.9$ 。结合第一点,预约影响集在这四类扰动上对工序依赖图划界是覆盖面的一致加强——不丢任何已纳入的占用;但它在集合规模上确有代价,两者不是覆盖面上的此消彼长。第三,通行变慢与阻断的划界两行逐格相同,在全部 50 对上影响集规模一致。这不是两次独立的划界验证:起点规则对二者都是「与失效时窗重叠、尚未结束的占用」,故它们按构造给出同一个起点集,进而给出同一个预约影响集。该行证实的是按工序依赖图划界对通行变慢同样为空。第四,修复一侧四类均满,逐类读数见表 7 末列,通行变慢与阻断同口径。通行变慢一度把与窗有交的穿越整段乘 2,13 格死在「占用偏短」——窗内 2τ 无空档时,进入时刻被拉回窗内却仍按原 τ 落盘;其中 12 格连把尚未结束的占用全部纳入改写也过不了,故不是集外保持原计划把变慢的车卡死。改为只缩放重叠进度之后,第 1 级满通过,不再触发扩大范围。走廊仍可走,与「整段封死再绕路」的物理差别还在,只是不再被整段倍率放大。车辆故障走换车,机械臂故障走改派。换车与改派是落实 A 类恢复的动作,用来补全覆盖矩阵的修复一侧。

这张表也给出了影响集规模的实测(注 2)。走廊阻断下预约影响集覆盖 t_{now} 之后尚未结束占用的约 92%;相对「把尚未结束的占用全部纳入改写」这一平凡上界只少纳入不足一成。有界修复真正省下的是不改写已经结束的占用与不重开搜索,而不是把未来切得很小。第 6.2 节按全表统计的 $C|/|R|$ 落在 0.56–0.59 与此不矛盾:全表包含 t_{now} 之前已经执行完毕、本就不可改的那一半。两个口径都给出。就贡献而言,本节只扩了覆盖面——把 A/B 二分与包含性从一种扰动推到四种;它没有加强任何一条主张的强度,也没有引入新的划界对象。

6.6 案例甘特

E1–E3 给出的是跨随机种子的计数与可行率。为把「工序依赖图覆盖不到、预约影响集可修」落到时间轴上,图 6 取 example_3x3x2、随机种子 42 的一例走廊阻断,协议同 E2/E3:决策时刻取 $0.35 C_{\text{max}}$,繁忙走廊单窗阻断,第 1 级改路、不扩大范围。

该例上 $T_{\text{impact}} = \emptyset$,而 $|Seeds| = 6$ 、 $|C| = 18$ 。图 6(a) 为扰动前原排程的机器甘特:蓝色工序的运输占用落入影响集(将被改路),灰色工序在影响集外(预提交、保持原计划);红色虚线为 t_{now} ,浅红带为阻断时窗。图 6(b) 为修复后:影响集内工序时间轴重排,排程在阻断下恢复可行, $C_{\text{max}} : 57 \rightarrow 86$,耗时亚毫秒级。本图只说明统计结论对应何种局部改动形态,不用于比较完工时间;完工时间与全局重调度的权衡见随后的 E5 与规模扫描。

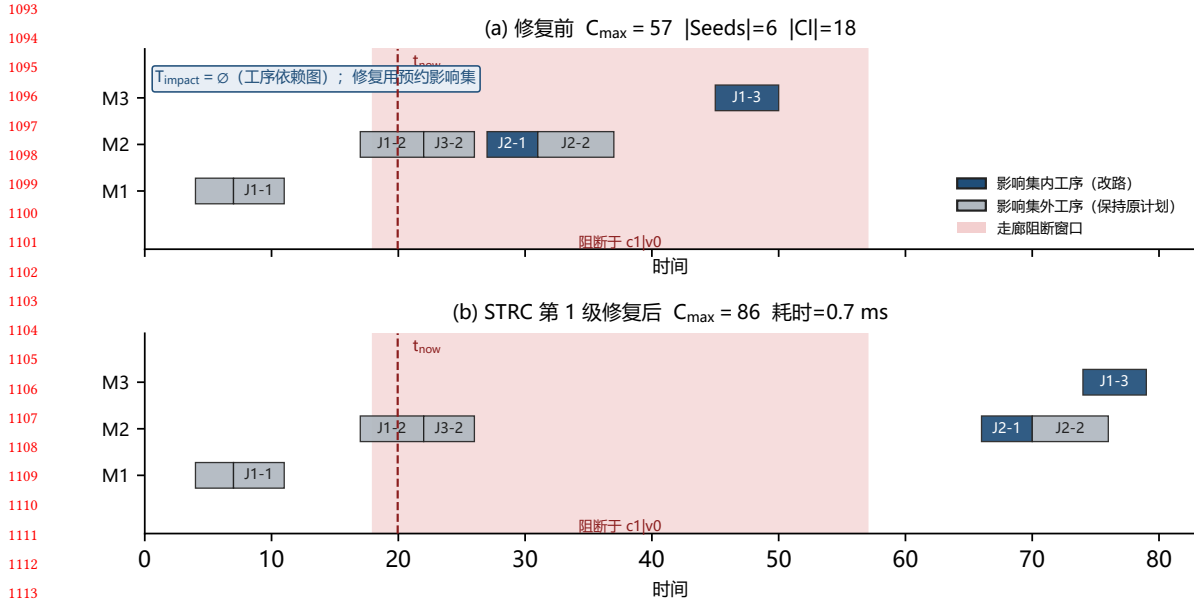


Fig. 6. 案例甘特(example_3x3x2, 随机种子 42)。 (a) 阻断前原排程,按是否属于 CI 着色; (b) 第 1 级修复后。工序依赖图上的影响域为空;蓝色工序对应影响集内运输被改路。本图为存在性演示:说明统计结论对应何种局部改动形态, $C_{\max}$ 的变化不作性能读数。

6.7 E4:结构(探索)

在 LU 割边阻断下,funnel 与 high 的预约影响集占比随随机种子波动(表 8)。方向上确实是 funnel 更高——中位 0.254 对 0.204,均值 0.244 对 0.229——但两组取值高度重叠:funnel 落在 $[0.180, 0.309]$,high 落在 $[0.156, 0.372]$,后者的区间把前者整个包住,且单个随机种子即可反向(2024 一列上 high 的 0.372 反高于 funnel 的 0.296)。五个随机种子、两个布局,这个差距不足以支撑任何结论。第 6.2 节按繁忙走廊阻断协议在三个同规模布局上得到的 $CI/|R|$ 亦落在 0.56–0.59 的窄带内,同样未能区分布局。

换一批不由本文设计的布局,这条负结果的成因才分得清。三张同规模布局同属哑铃一族,几何差异很小(见表 9:节点数 9–11、走廊数 8–12,LU 割仅在 1 与 2 之间);「指标太粗」与「算例集几何差异不足」这两种解释在它们身上混在一起,无从分辨。第 6.1 节的第二批把两者分开(表 9)。

结果的方向与预期相反,而这恰是关键。按第 6.1 节的声明,这批算例在路网几何上只有 2 个独立样本,故不能用它来论证「影响集占比随路网几何变化」;能论证的是另一件事。在同一张 4×4 路网上,只把机器台数与落位从 4 机换成 5 机,影响集占比中位即由 0.512 落到 0.305,极差 0.207;同一张 5×5 路网上换三种机器配置(6、7、8 机),极差 0.075。作为对比,逐参数同口径的三张自建布局——它们是三张不同的路网——只落在 0.446–0.497,极差 0.051。即:路网固定而机器配置变动,影响集占比的移动幅度可以超过换三张不同路网的幅度—— 4×4 那张上约四倍, 5×5 那张上约一点五倍。须说明两侧变动的因子数不同:左侧同时换了机器台数与落位,右侧三张自建布局均为 4 机、只换路网。还须说明右侧这个基准偏弱:按本节开头所述,三张自建布局的几何差异本就很很小,故 0.051 是「换路网」幅度的一个下界,不是它的代表值。两处合起来,这个不等号只支持「机器配置这一维不可忽略」,不支持「机器配置的效应大于路网几何」。两张路网上都成立的是不等号的方向,倍数本身只有两个样本,不宜细读。

表 8. E4 预约影响集占比 $CI/|R|$ (LU 割边阻断;随机种子 42, 7, 2024, 99, 123)。本表算例为 12 工件 / 8 机 / 12 车、运输与加工时长比标定为 4.0。该口径与表 9 不同(后者为 8 工件 / 4 机 / 4 车、比值 1.0、十个随机种子),两表虽共用 funnel/high 这两个布局名, 数值不可跨表比较;表 9 内部才是同口径对照。

布局	42	7	2024	99	123	中位
funnel	0.254	0.181	0.296	0.309	0.180	0.254
high	0.156	0.204	0.372	0.229	0.184	0.204

表 9. E4 布局出外外部化对照(LU 割边阻断,十个随机种子; $CI/|R|$ 取中位)。全表逐参数同口径,只差路网与机器配置。外部算例只落在 2 张路网上 ($N_1:4 \times 4$ 去一条边; $N_2:5 \times 5$ 去两条边), 组内各行共享同一路网,只差机器台数与落位;「极差」一列按组内给出, N_1 组仅 2 行、自建组 3 行,故组间极差之比只作量级参考。LU 最小割与漏斗占比在整个外部批取值恒定。边权为本文补齐的等权值,故本表不与外部文献的参照值比较。

出外/路网	算例	机器	节点/走廊	LU 割	漏斗占比	$CI/ R $	组内极差
外部 N_1	LyuL2	4	16/23	2	0	0.512	0.207
外部 N_1	LyuL3	5	16/23	2	0	0.305	
外部 N_2	LyuL4	6	25/38	2	0	0.385	0.075
外部 N_2	LyuL5	7	25/38	2	0	0.422	
外部 N_2	LyuL6	8	25/38	2	0	0.460	
自建	high	4	10/10	2	0.286	0.497	0.051
自建	funnel	4	9/8	1	0.286	0.491	
自建	mid	4	11/12	2	0.286	0.446	

于是只由路网决定的最小割解释不了影响集规模。在这 5 个外部算例上,装卸点最小割 (LU 割) 恒为 2、漏斗占比恒为 0——两张路网都把装卸站放在网格角点,四邻接网格的角点恰有两条出边,这个割因此被钉死;同一工具集另附的那族布局(因允许对角移动未纳入本批)把装卸站放在网格边中点,出边数为 3。即该指标在真实布局上只取到少数几个由装卸站所在网格位置决定的值,不随几何连续变化。关键在于:这两个指标在上述整段变动中一动不动,而被解释的量已经变了 0.207。一个取值恒定的量不可能解释一个如此变动的量,所以它们连「相关性弱」都谈不上,是无从谈起;第三个指标(每节点走廊数)在整批上只取到两个值(23/16 与 38/25),同样不足以解释组内的变动。

据此可把读数收紧为:在这 5 个外部算例与三张自建布局上,静态割不解释影响集规模。这一族指标本是围绕哑铃布局那个可调的装卸点咽喉设计出来的,迁到真实布局上就退化成常量,不具备解释力。替代方向由此指向需求侧:决定影响集规模的不是路网能提供多少条通路,而是需求落在哪里;具体的候选量见第 7.2 节。就贡献而言,本节是探索性的负结果,不支撑任何一条贡献——它只说明本文围绕哑铃布局设计的那族静态指标不宜外推,并未给出可替代的预测指标。

6.8 E5:与全局重调度的权衡

本小节原拟找一个交叉点:预算紧时有界修复占优,预算放宽后热启动全局重调度在 $C_{\max}$ 上反超。在所测的 0.2–2 s 区间内不存在这样的交叉点,且可向更大预算外推,而原因不是样本不够,是两条曲线的形状:R2 是一次过的定点,同一格里三个预算档共用同一次计算, $C_{\max}$ 不随预算变;R0+ 报的是逐代最优,随机种子固定后加大预算只是让同一条搜索轨迹多跑几代, $C_{\max}$ 只能不增。两者的次序一旦在最小预算档上定下,加预算便无从反转,于是只需看最小档:12 个算例-随机种子格里, R0+ 在 11 格已严格更优、1 格持平,无一格更差。

须就这条非存在的方向说清:上面的单调性只能向更大预算外推,更小的预算未扫。同一条单调性反过来说明低预算一侧应当出现次序反转——R0+ 每评估一个候选至少要付一次解码(同批 4.16 ms,第 6.9 节),按其种群规

表 10. E5 与不改写已结束占用的热启动全局重调度(3 个随机种子均值)。「改动比例」为被改写的占用占全表之比。本表只含自建布局,共 2 算例 $\times$ 3 随机种子 $\times$ 3 预算点,独立格数 6;两列 $C_{\max}$ 相比,R0+ 在每个预算点上更优。连外部布局批次(第 6.12 节)合读为 12 格 36 点,逐点胜/持平/负 35/1/0。R2 不随预算变,故每算例三行共用同一个 R2 定点。

算例	预算/s	R0+ $C_{\max}$	R2 $C_{\max}$	改动比例 R0+ / R2
congested_8x4x4	0.2	279.3	299.0	0.61 / 0.57
	1.0	276.0	299.0	0.61 / 0.57
	2.0	275.7	299.0	0.61 / 0.57
example_3x3x2	0.2	78.3	88.7	0.60 / 0.60
	1.0	78.3	88.7	0.60 / 0.60
	2.0	78.3	88.7	0.60 / 0.60

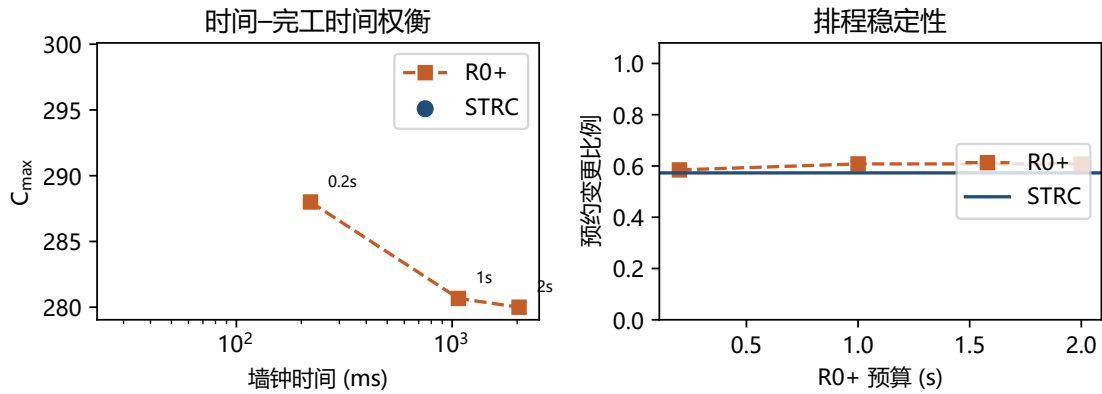


Fig. 7. E5:不改写已结束占用的 R0+ 预算扫描与有界修复定点(congested_8x4x4, 3 个随机种子均值)。左:算法耗时- $C_{\max}$,两条曲线不相交;右:占用改动比例,两法同在六成附近。

模,光把初始种群评估完所需的挂钟就已与最小预算档同量级,而 R2 在同批只需 2.74 ms 且全格可行。故预算再收紧时 R0+ 会交不出一代,那一侧的次序本文不作断言;所测最小档恰压在这个边界附近。这不影响本文的立论方向——本文要否掉的是「有界修复在 $C_{\max}$ 上更优」,而低预算侧的反转恰恰对有界修复有利,故此处不取该读数。

表 10 与图 7 给出其中自建布局的一半:两个算例 $\times$ 随机种子 $\{42, 7, 2024\} \times$ 预算 $\{0.2, 1, 2\}$ s。第 6.12 节在两个外部布局上按同一份代码、同一组参数重跑同一协议;两批合读共 4 个算例、12 个算例-随机种子格、36 个预算点,逐点 R0+ 胜/持平/负为 35/1/0,上述单调性与定点两条在 12 个格上逐格核过。界限仍须说清:36 个点不是 36 份独立证据,算例这一维只有 4 个,故本节不作显著性断言。所测区间内及其以上的非存在由上面那条单调性给出,与样本量无关;算例维上的普遍性则只到这 12 个格子——换一批算例是否仍无交叉,本文未检验。

有界修复的完工时间全区间较差;算法耗时低两至三个数量级(以第 1 级改路的 3.2 ms 对 0.2-2 s 预算计,见图 7 左)。这一耗时差来自单遍改路、不重开搜索,不是影响集划界的功劳——第 6.9 节以耗时相同的 RA 对照证实这一点。与 R0+ 的改动比例则同在 50%-66% 量级(少改写须看第 6.9 节与 RA 的对照:两边改写比例已经接近,不能从本表读出稳定性)。响应须在毫秒量级时,有界修复能恢复可行;允许秒级停机时,不改写已结束占用的热启动全局重调度在完工时间上仍占优,但优势幅度已远小于从 $t = 0$ 重排的那一档。 $C_{\max}$ 是本领域的主指

表 11. E7 毫秒档内对照(50 对,协议与 E3 相同:繁忙走廊单窗阻断、 $t_{\text{now}} = 0.35 C_{\text{max}}^0$ 、R2 不扩大范围)。四法均 50/50 可行。「已结束占用越界」为改写了已结束占用的格数;「允许改写」为该方法纳入改写的占用占 t_{now} 之后尚未结束占用的比例;未列为该方法对 R2 的 C_{max} 胜负。RA 与 R2 只差允许改写哪些占用,故这两行之差可全部归因于预约影响集。本表不可与表 10 并读——那批只有两个算例。

方法	已结束占用越界	ms(中位)	平均退化	改动比例	允许改写	对 R2 赢/平/输
RS 全局右移	0/50	1.42	58.8%	0.627	—	7/16/27
RD 重解码	0/50	4.16	49.0%	0.618	—	22/14/14
RA 不按影响集划界	0/50	2.76	49.9%	0.604	1.00	0/46/4
R2 有界修复	0/50	2.74	49.8%	0.540	0.92	—

标,故按它报告。第 5.3 节所说的对照,指的是两者在算法耗时约束下各自可用,不是指存在某个预算区间使 R2 的 C_{max} 更优。

本表的 R0+ 按第 5.3 节的固定前缀解码,不改写已经结束的占用。已结束占用不可改写的审计上,小例与拥堵例各 9 个预算点越界均为 0; 同工件后道已出车、前道还要重定时,改为强制原车、只重规划 t_{now} 之后的尾段,历史空载前缀得以保留。有界修复在同样这些格上仍一律为零。与「从 $t = 0$ 重排」的旧对照相比, C_{max} 差距大幅收窄,改动比例不再是百分之百对六成;但两者的次序未变,仍无交叉。缺口里原先混着的「改写已经结束的占用」已经被拿掉,剩下的是全局改派改序相对单遍改路的那一截。就贡献而言,本节只落一条限定:预约影响集的净作用不在完工时间上,适用位置是毫秒档;净作用究竟是什么,由第 6.9 节的 RA 对照回答。

6.9 E7:毫秒档内的对照

上一节的对照是热启动种群搜索,预算 0.2–2 s。只用它作对照会留下一个问题:「低两至三个数量级」这个读数,有多少来自预约影响集,又有多少只是因为对照耗时更长? 本节把阶梯中间那两档耗时更短的全局重算补上。

- **RS(全局右移)**。不改路径、不改指派、不改扫描序,把未完成占用整体后推一个延迟 Δ , Δ 取到刚好让受阻走廊上所有可动的占用落到阻断窗之后。不改写已经结束的占用($t_{\text{end}} \leq t_{\text{now}}$ 不可动),与 R2 相同; 因为是统一平移,一切间隔要么不变、要么变大,而全部约束都是「 $\geq$ 」型,无需重新路由即得可行解。它是「不按影响集划界」的一端:连改路都放弃(第 2.1 节)。
- **RD(原染色体重解码)**。保持机器指派与扫描序,在装了阻断的路由层上走与 R0+ 同一套固定前缀解码。它是本文实现里耗时更短的一次全局重算;不改染染色体,因而比 R0+ 耗时更短,也更少改派改序的自由度。
- **RA(不按影响集限制范围,但保留改路)**。把 t_{now} 之后尚未结束的占用全部纳入改写,再走与 R2 完全相同的改路重放。它是「不按影响集划界」的另一端:与 RS 不同,它保留了改路,因而与 R2 只差允许改写哪些占用。两者同一套改路程序,都不改已经结束的占用,共用同一段阻断。因此它是本文唯一能把预约影响集单独隔离出来的对照——两法之差不含改路程序、协议或实现的贡献。RA 已是最大允许改写集合,无需失败后扩大范围。

E3 比较的是两种不同的划界对象(工序依赖图 vs 预约影响集),而 RA 问的是:要不要按影响集限制范围。

表 11 给出四条读数。

其一,在给出可行方案的各法中,唯一比有界修复更快的是全局右移,而它在完工时间与改写比例上都较差。(按工序依赖图划界的 R1 更快,但它在 0/50 上恢复可行,不构成候选。) RS 只要 1.42 ms,约为 R2 的一半;代价是完工时间平均退化 58.8%(R2 为 49.8%),逐格对比 27/16/7(R2 赢/平/输),且改动的占用反而更多(0.627 对 0.540)——统一平移把每一条尚未结束占用的时刻都改了。若想把右移做得有选择——只推迟真正受影响的车,其余不动

——就必须先知道哪些占用受影响,那正是本文划定的范围。右移之所以能不按影响集划界,恰恰因为它放弃了选择。

其二,耗时更短的一次全局重算仍比一次有界修复更长。RD 的耗时中位数是 4.16 ms,为 R2 的 1.5 倍。这条读数与搜索配置无关:任何基于解码的搜索,每评估一个候选都要付至少一次解码的代价。因此上一节「低两至三个数量级」并不是对照选得耗时更长造成的——把对照换成同一实现里耗时更短的那一档,有界修复仍然更快。

其三,不改写已结束占用之后,RD 与 R2 的完工时间在本样本上不可区分,但 RD 改动更多。全表看 R2 对它是 14/14/22(赢/平/输),平均退化 49.8% 对 49.0%。这一差别经不起检验:配对差均值 +0.006,bootstrap 95% 区间 $[-0.007, 0.019]$ 跨过 0;Wilcoxon 符号秩双侧 $p = 0.12$ (非零差 36 格); $C_{\max}$ 比值均值 0.997、区间 $[0.988, 1.007]$ 亦跨过 1。故此处只报「未观察到差异」,不报方向。已结束占用越界已是 0/50:降级后道改为强制原车、只重规划决策时刻之后的尾段,历史空载前缀不再丢。故即便逐格计数上 RD 略占上风,也不能把它写成「来自改写已经结束的占用」——这是同染色体、只排未来时,全局改路相对单遍改路的那一截。改动比例 RD 为 0.618,高于 R2 的 0.540:少改写仍在按影响集划界的一侧。

其四,少改写只能从 R2 对 RA 读出,而且读到的只是稳定性。RA 与 R2 只差允许改写哪些占用,因此这一对读数直接回答了按影响集划界的净收益。预约影响集平均只比平凡上界少纳入 $1 - 0.92$ 的尚未结束占用(逐格 0.80–1.00,取到 1.00 的 6 个格上影响集就是全部尚未结束占用,两法恒等)。就是这不足一成的差别,把改动比例从 0.604 降到 0.540:平均降 0.064、中位降 0.029,逐格 31/18/1(R2 更稳/持平/更差),Wilcoxon 符号秩双侧 $p = 8.8 \times 10^{-7}$ 。须说明有效样本量:上述 6 个恒等格不是两法的比较,剔除后为 44 格、逐格 31/12/1、平均降 0.073(Wilcoxon 的非零差格数两种算法下都是 32);剔除使降幅估计变大,故按 50 格报告是偏保守的一侧。方向高度一致,幅度不大——唯一的反例格上 R2 反而多改 0.007,一并记下。与此同时算法耗时几乎相同(2.74 对 2.76 ms),完工时间也几乎相同(比值均值 0.999,逐格 R2 赢/平/输 4/46/0、从未更差,最占优的一格为 0.970)。

这三项合起来才是重点。耗时相同,说明毫秒级响应来自单遍改路、不重开搜索,而不是来自预约影响集(读数见本节表 11;单遍改路本身已是既有做法,见表 2)。完工时间相同,说明影响集不是一种优化手段。改动比例显著更低,说明划界落实的恰是命题 3 承诺的那个量:集外占用的走廊、时段与车辆不变。影响集的作用在于标出哪些占用不必改。幅度随影响集排除得多而变大,方向一致,但排除集本身只能解释其中一部分——被禁止改写的占用即便全部计入,也不足以补足 0.604 – 0.540 的全部落差,余下部分来自允许改写的占用集合变小后改路结果本身的差异,本文不再细分:在影响集接近全部尚未结束占用的算例上(congested_8x4x4,允许改写占比 0.94)降幅只有 0.010,而在排除得多的算例上(S8x4x4_mid,0.91)降幅达 0.118。两个算例定不出比例关系,能说的只是方向;逐格分布见下。

把这一方向写成一条事后分档。图 8 以允许改写占比 $CI/|R^0|$ 为横轴、RA 相对 R2 的改动比例降幅为纵轴,画出 50 对。在本样本上取 $CI/|R^0| \geq 0.93$:该线以上 23 格平均降幅 0.029,以下 27 格平均降幅 0.094;占比升到 0.97 以上的各格降幅均已归零,但成因有两种:占比恰为 1.00 的 6 格影响集就是全部尚未结束占用,两法恒等;其余各格占比尚不足 1.00 而降幅已为 0,属实测而非恒等。这是一条事后分档,阈值在本表上选定,不作外推定理;它回答的是「何时按影响集划界还值」,不是影响集规模的结构预测(后者仍未建立,第 6.7 节)。

四法并读的收口是:在「不改写已经结束的占用、且响应在毫秒量级」这两个约束下,按影响集划界的净收益只体现在改写量上——同等速度、同等完工时间下,不划界要多改约 6 个百分点的占用(相对多约一成二),它不包含速度或完工时间上的任何优势。这一层回答的是划界的净收益;「划界对象是否成立」则由第 6.2 至 6.4 节支撑。放宽耗时约束后更短的完工时间仍来自热启动搜索(第 6.8 节),但那已不是毫秒档。

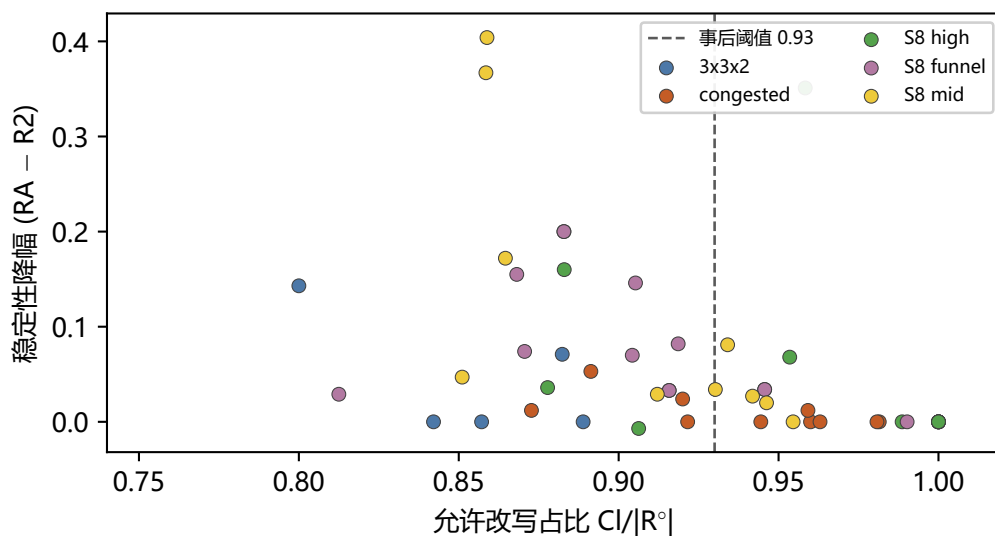


Fig. 8. E7 事后规则:允许改写占比与稳定性降幅(50 对, R2 对 RA)。虚线为样本内阈值 0.93;纵轴为正表示按影响集划界后改动比例更低。

表 12. 扰动规模对照(congested_8x4x4, 10 个随机种子平均)。有界修复含扩大范围;R0+ 预算 2s。离散度按四分位距报告:STRC 耗时全扫描极差为 2.2–23.8ms, R0+ $C_{\max}$ 的逐档 IQR 在 8–76 之间。「耗时比」一列在最小两档上的档内 IQR 已超过该列的档间起落, 故它只作量级读数, 不指示随 φ 的趋势。该列为逐格比值的档均值(先配对、后统计), 因此不等于相邻两列档均值之比——两者由 $1/x$ 的凸性必然不同, 复算时请用逐格数据。分子是 R0+ 的挂钟预算而非其实测耗时, 故这不是同质量下的比较(第 6.1 节)。

φ	STRC 可行	STRC ms	R0+ $C_{\max}$	耗时比
0.10	100%	9.1	103.5	406×
0.25	100%	11.1	107.0	325×
0.50	100%	8.6	111.8	333×
0.75	100%	8.4	125.8	254×
1.00	100%	10.7	148.1	203×

6.10 扰动规模扫描

表 12 与图 9 报告 φ 扫描 (congested_8x4x4, 10 个随机种子; R0+ 预算 2s)。逐档读数见表; $C_{\max}$ 仍全由 R0+ 更优, 与第 6.8 节一致。小例 example_3x3x2 上同样每格可行(10 个随机种子 $\times$ 五个 φ 值), 有界修复约 1ms 量级, 耗时比 87×–3051×(跨两个算例的逐格极值)。这里分母是有界修复的实测挂钟, 分子是 R0+ 的预算, 而 R0+ 在 $C_{\max}$ 上更优, 故它不是「加速比」, 也不构成同质量下的比较(第 6.1 节已声明各法不在同一预算档上比较)。

这里有界修复打开了失败后扩大范围, 故与 E3/E5 不可直接比较: 扩大范围是把可行率拉到 100% 的步骤, 本身已有成例(第 2.1 节)。本节不支撑任何一条贡献, 只落一条限定: 即使扰动比例升至 $\varphi = 1$ (全部未来工序受扰), 算法耗时仍在十毫秒量级、不随规模崩溃; 这一耗时来自单遍改路, 不是影响集划界的功劳(第 6.9 节)。

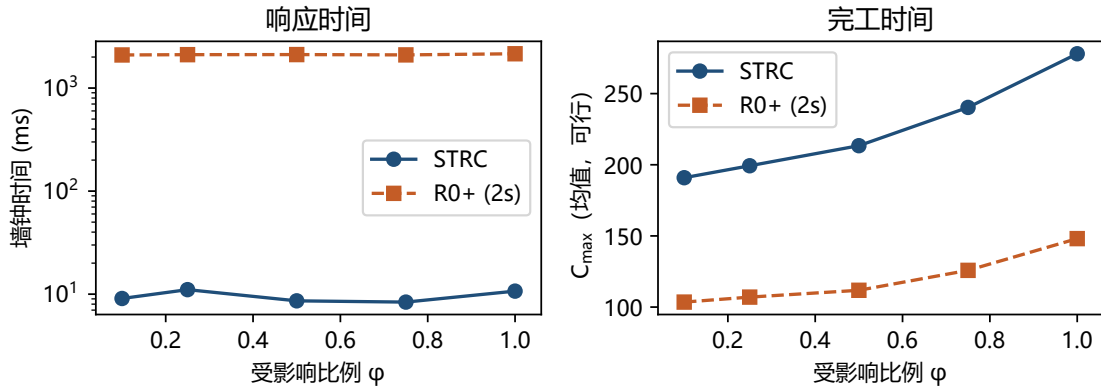


Fig. 9. 扰动规模扫描(congested_8x4x4, 10 个随机种子): 有界修复与 R0+ 的算法耗时(对数轴)与完工时间随 φ 变化。曲线取逐档均值, 离散度口径与表 12 同(四分位距);耗时一侧全扫描极差 2.2–23.8 ms, 始终在十毫秒量级, 这是本节唯一据以立论的读数。

表 13. E8 算例规模扫描(7 档 $\times$ 10 个随机种子)。「影响集」为预约影响集占全表之比, 该比的可达上界是 $|R^o|/|R|$ 、本批均值约 0.61; 换以可改写集合为分母则为 0.78–0.91(见正文)。耗时取中位数, 「RD/R2」一列即两列中位数之比; 正文讨论其单调性时用的是逐格配对后的档均值, 两种口径的档间起落一致但数值不同。未列为 R2 对 RS 的 $C_{\max}$ 胜负。

规模	$ R $	影响集	R2 ms	RD ms	RD/R2	R2 对 RS
$8 \times 4 \times 4$	148	0.561	2.9	4.4	1.5 $\times$	7/1/2
$10 \times 5 \times 5$	172	0.485	3.2	6.1	1.9 $\times$	9/0/1
$12 \times 6 \times 6$	230	0.481	4.5	10.7	2.4 $\times$	7/1/2
$14 \times 7 \times 7$	281	0.492	6.1	14.5	2.4 $\times$	8/0/2
$16 \times 8 \times 8$	291	0.534	6.4	16.4	2.6 $\times$	10/0/0
$18 \times 9 \times 9$	356	0.535	8.2	26.4	3.2 $\times$	10/0/0
$20 \times 10 \times 10$	402	0.476	10.4	34.2	3.3 $\times$	10/0/0

6.11 E8: 算例规模上的外推

上一节扫的是扰动的规模, 算例始终是 8 工件 4 机。本节换一维: 固定扰动协议, 把算例本身放大。这一问的要害不在耗时——耗时不崩是可以预期的——而在影响集占比会不会随规模涨到接近 1, 使「有界」名存实亡。

规模序列取工件数 $2k$ 、机器数 k 、车数 k , $k = 4, \dots, 10$, 即 $8 \times 4 \times 4$ 到 $20 \times 10 \times 10$, 共 7 档 $\times$ 10 个随机种子 = 70 对。拥堵档、异构度、柔性度、运输/加工时长比与装卸点最小割、远端割全部按同一目标标定, 只有规模变。三条对照与第 6.9 节同定义。

逐档读数见表 13。

影响集占比不随规模恶化, 但「接近 1」之疑须换分母才算回答。七档 $CI/|R|$ 在 0.48–0.56 之间波动、并不单调(首档最高、末档最低, 第五、六两档回到 0.53 以上)。这里必须把分母交代清楚, 否则会读出过强的结论: CI 只取 t_{now} 之后尚未结束的占用, 而本批 $|R^o|/|R|$ 均值仅 0.61, 故 $CI/|R|$ 的可达上界本就不是 1 而是约 0.61——用它回答上面那一问并不切题。换成可改写集合作分母, 七档 $CI/|R^o|$ 落在 0.78–0.91(逐格最高取到 1.00), 与第 6.5、6.9 两节主批次的 92% 同量级。所以本节支持的是占比不随规模恶化, 不是「有界」在绝对量上宽裕——后者已由注 2 否认。这也不是一个渐近主张: 七档不足以拟合任何增长率, 能说的只是在这段区间内它没有退化。

算法耗时的增长快于占用总数的增长。 $|R|$ 增至 2.7 倍时, R_2 的耗时中位数从 2.9 增至 10.4 ms、即 3.6 倍, 仍在十毫秒量级; 七档定不出指数, 故这里只报两端之比, 不写成「线性」或「超线性」。第 1 级改路的可行格数为 69/70; 唯一失败的一格($10 \times 5 \times 5$, 随机种子 42) 由失败后扩大范围在第 3 轮兜住, 总耗时 12.0 ms、完工时间与首级尝试相同, 故终可行行为 70/70。

两个对照的差距随规模拉大。耗时更短的全局重算与有界修复的耗时比从 $1.5\times$ 升到 $3.3\times$ ——规模越大, 重算一遍越不划算。这里只报两端: 逐档比值并不单调(逐格配对后的档均值在 $k = 6 \rightarrow 7$ 处回落)。两端相差 1.8, 而任一档内的四分位距不超过 0.74、每档 10 格档均值的抽样波动远小于该跨度, 故总体在升不是噪声; 但增长形状本文不报; 而对不按影响集划界的右移, R_2 的 $C_{\max}$ 胜负在最后三档均为 10/0/0, 前四档则在 7–9 胜之间没有单调变化; 每档只有 10 格, 故这里只报末三档的全胜, 不报趋势。

口径限制。这一规模序列只有一个拥堵档、一个算例随机种子(每档的算例本身由随机种子 42 生成), 因而它检验的是规模这一维, 不能替代第 6.1 节主批次在拥堵结构上的对照; 第 6.5、6.10 两节的扫描也未在这批算例上重跑。就贡献而言, 本节只为 C_2 的有界性补一条规模方向的限定: 占比在这七档上没有被稀释, 但这不涉及净收益, 也不构成渐近结论。

6.12 外部布局批次的复现

第 6.1 节第二批把布局出处换成外部来源后, 50 个算例–随机种子上 $E_1/E_2/E_3/E_5$ 的读数与主批次逐项同向: 工序依赖图给出空范围 50/50, 结构包含性(即泄漏计 0) 50/50, 集外字段逐条不变 50/50; 边界消融下第 1 级改路的可行格数为 0/50, 按预约影响集划界为 50/50。E1 协议下的影响集占比逐布局中位落在 0.438–0.547; 同口径的主批次读数是 50 对合池中位 0.571(0.56–0.59 是逐算例均值的极差, 口径不同, 不宜与上句直接对读)。外部批整体略低, 但两者同处半数上下的量级, 且该偏低与逐算例间差异同量级(第 6.2 节图注); 本文未对它作归因。与全局重调度的权衡亦无变化: 17/18 个预算点上 R_0+ 的 $C_{\max}$ 更优, 余下 1 点两法持平(LyuL6_8m, 随机种子 2024, 预算 0.2 s), 无一点更差。这批与主批次跑的是同一份 E5 代码、同一组参数, 故第 6.8 节按 12 个算例–随机种子格合读两批; 持平的那一格也满足该节的单调性判断, 交叉点仍不存在。

这一批的意义不在于给出新的性能数字, 而在于回答「这些现象是否只在本文自己设计的布局上成立」: 上列三条读数在一批不由本文选定的拓扑上同样成立, 故 C_1 与 C_2 的对象层不依赖本文的布局设计。唯一被这批算例改写的结论是结构可预测性(第 6.7 节), 而它本来就是负结果。

6.13 小结

本章读数按其支撑的贡献层归并; 各条的局限、它威胁与不威胁哪一层, 集中见第 7.1 节。

对象层(C_1 、 C_2 : 按什么划界、划出的集合是否唯一确定) 由四组读数支撑。走廊阻断下工序依赖图上的范围为空而原排程确已不可行(E_1 , 50 对上 50/50); 预约影响集在依赖边上封闭、集外字段逐条不变(E_2 , 50/50、50/50); 同一套改路程序只换划界对象, 恢复可行率即由 0/50 变到 50/50(E_3), 可行与否因此来自划界对象, 而不是改路程序的优劣; 四类扰动与两种划界的交叉上 A/B 二分无例外, 且 A 类上预约影响集一致包含工序依赖图划界(E_6)。命题 1–3 给出对应的结构陈述, 其中命题 3 仍只作充分条件。

净收益层(C_3 : 这样划界换来什么) 只由一组读数支撑: 换用不按影响集限制范围的对照 (R_A , 与 R_2 同一套改路、同样不改已经结束的占用), 算法耗时与 $C_{\max}$ 几乎不变, 改动比例却由 0.540 升到 0.604(逐格 31/18/1, $p = 8.8 \times 10^{-7}$; 第 6.9 节)。故毫秒级响应来自单遍改路而非影响集, 少改写只能从这一对照读出。与热启动全局重调度相比, 有界修复在 $C_{\max}$ 上无一格更优, 放宽预算也不出现反超(E_5); E_7 则排除了「对照耗时更长」这一疑问。

余下两组读数不支撑任何贡献, 只给限定: 规模扫描已扫至 20 工件 10 机, 以可改写集合为分母的影响集占比未随规模恶化(E_8); 结构可预测性是负结果(E_4)。第二批算例(50 对) 只检验上述现象是否依赖本文自选的布局, E_1 、 E_2 、 E_3 、 E_5 逐项复现。

7 总结

本文有三项贡献。**其一**,指认了一类工序依赖图覆盖不到的损坏:走廊阻断不改任何工序指派,按受影响工序划出的范围为空而原排程确已不可行(50 对上 50/50,第 6.2 节)。**其二**,把重调度范围定义为预约影响集(STRC):依赖关系一经给定,一条占用是否属于该集唯一确定,集内没有指向集外的依赖边(50/50、50/50,第 6.3 节);这一层不依赖下面的净收益读数。**其三**,给出与该划界匹配的局部恢复,并分清各项读数各来自何处:同一套改路程序只换划界对象,恢复可行率即由 0/50 变到 50/50(第 6.4 节),可行与否因此来自划界对象,而不是改路程序的优劣。

构成影响集的那几个机制——让行关系、集内改路而集外保持原计划、失败后扩大允许改写的范围——分别已见于既有文献(第 2.5 节),本文不把它们当作贡献。本文主张的是:工序依赖图按定义不含走廊占用之间的让行关系,因而覆盖不到只使占用失效的扰动;改到预约依赖图上之后,须改写的占用由既定先后唯一确定,而不是一个启发式半径。

把允许改写的集合从预约影响集换成「 t_{now} 之后尚未结束的全部占用」、其余一切不变时,算法耗时与完工时间几乎不动,改动比例却由 0.540 升到 0.604(第 6.9 节)。故毫秒级响应来自单遍改路、不重开搜索;少改写只能从这一对照读出,落实的是命题 3 承诺的量:集外占用保持原计划。收益幅度取决于影响集小于该平凡上界的程度,故两者接近时趋于消失。

7.1 局限

以下四条按对前文读数的影响排序,第 7.2 节逐条给出推进方向。

- (1) 完工时间劣于不改写已结束占用的热启动全局重调度,且放宽预算不出现反超。有界修复以完工时间换取算法耗时,而这一劣势在所测的 12 个算例-随机种子格上不随预算放宽而反转(第 6.8 节)。本条威胁「按预约影响集划界的净收益」这一层,不威胁「须改写哪些占用由结构唯一确定」这一层:少改写只能从与 RA 的对照读出,不能从与 R0+ 的对照读出(第 6.9 节)。
- (2) 对预约影响集,命题 3 的保证只是充分条件,依赖边集未经独立的穷尽检验,允许改写的集合不紧,其规模也不能由仅依赖路网的静态指标预测。影响集覆盖 t_{now} 之后尚未结束占用的约 92%,本文不作最小性声称(注 2);净收益的幅度取决于影响集小于该平凡上界的程度,故两者接近时收益趋于消失。静态割这一族指标已由第 6.7 节排除,但该否定只针对「静态割能解释影响集规模」,并不等于「路网几何与影响集规模无关」。本条威胁对象层保证的强度与紧度,不威胁「按工序依赖图划界会给出空范围」这一诊断读数。
- (3) 实现覆盖小于正文所述的问题范围:B 类扰动仅以改路响应,A 类另开换车与改派但不改工序顺序,且由假设 A3 只做一次响应。放开工序顺序即向全局重调度退化,「有界」随之失去边界;扰动流、预测误差与滚动响应均未涉及。规模一维已扫至 20 工件 10 机且影响集占比未随规模上升,但所扫描数不足以支撑任何渐近论断。本条威胁读数向更大规模与连续扰动的外推,不威胁协议内已报的读数。
- (4) 外部参照缺位:这一类研究没有可换用的公开基准,算例出处只外部化到拓扑一层,读数亦未在第二套实现上复现。公开算例族 [3, 6] 把运输时间发布为机器间行程时间矩阵而不是路网,两族共 11 张布局逐张检验没有一张能还原成与所发布矩阵一致的无向走廊图, R 、 G_R 、 $Cl(\cdot)$ 与 B 类扰动在其上一概无从定义(第 6.1 节)。第二批算例按 Lyu 等 [10] 的附录布局构造,布局因此不再由本文设计,但逐段行驶时间与工件数据仍出自本文,故不能用来复现 Lyu 或 van Os [20] 的参照值,其覆盖范围也小于主批次。本条威胁外部效度,不威胁同一实现内各对照之间的相对读数。

7.2 后续工作

下列四条与上一节的四个局限一一对应。

一、正视完工时间上的全区间劣势(局限 1)。前缀解码对已结束占用的改写已在主批次消除(E5 的 18 个预算点越界 0, E7 上 RD 为 0/50)。局限 1 余下的即 $C_{\max}$ 本身, 本文不以更换加权指标的方式规避。若要缩小差距, 须在不改写已结束占用的前提下作有限度的改派或改序, 而此举会向全局重调度退化。

二、使预约影响集的保证更完备、更紧, 并为其规模建立刻画(局限 2)。完备性: 接壤已并入让行边, 重跑后试探泄漏为 0。下一步是换一种扰动形态(例如缩短占用、或延后超过 1 个单位)再探, 而不是再补同一条边。紧度, 指向最小允许改写集合: 在固定修复能力下定义最小性, 并给出影响集与之的差距, 这是把「有界」从充分条件推进到紧界的必经一步; 当前影响集覆盖约 92% 的尚未结束占用, 两者的差距可能相当大。规模刻画目前只有一条事后规则(允许改写占比, 图 8), 但它随排程而变; 须改用一族可在扰动前计算的指标: 第 6.7 节已把静态割这一族排除——它在真实布局上取值恒定, 而同一张路网上单换机器配置就会变动: 4×4 那张上由 4 机换 5 机即变动 0.207, 5×5 那张上换三种配置(6、7、8 机)变动 0.075。后者提示了方向: 起作用的似乎是需求的空间分布, 而不是路网所提供的通行能力。下一个候选是 t_{now} 邻域内的走廊占用时序密度, 例如受扰走廊在其繁忙窗口内的重叠占用条数、以及该走廊在让行图上的出度。这类量随排程而变, 不再是纯拓扑量, 「可预测性」的提法也须随之改为给定布局与当前排程预测规模。

三、放开假设 A3(局限 3; A3 为单次、完全观测)。下一步不在于进一步开放改序, 而在于放开该假设, 考察影响集在连续扰动下是否会累积膨胀, 以及两次修复之间是否需要显式的「归位」步骤。

四、把时间标定也外部化(局限 4)。布局出处已解决一半; 要补齐另一半, 仍需一份同时发布排他路网与逐段时长的算例族, 自建边权扫描不能替代。至于第二套独立实现, 无须单独立项: 上述任何一项复现时即可一并完成。

Acknowledgments

本文工作由 <待填: 基金项目名称与编号> 资助。作者感谢匿名审稿人对实验口径与结论边界提出的意见。

利益冲突声明

作者声明不存在与本文工作相关的利益冲突。

References

- [1] Riyad J. Abumaizar and Joseph A. Svestka. 1997. Rescheduling job shops under random disruptions. *International Journal of Production Research* 35, 7 (1997), 2065–2082. doi:10.1080/002075497195074
- [2] M. Selim Aktürk and Elif Görgülü. 1999. Match-up scheduling under a machine breakdown. *European Journal of Operational Research* 112, 1 (1999), 81–97. doi:10.1016/S0377-2217(97)00396-2
- [3] Ümit Bilge and Gündüz Ulusoy. 1995. A Time Window Approach to Simultaneous Scheduling of Machines and Material Handling System in an FMS. *Operations Research* 43, 6 (1995), 1058–1070. doi:10.1287/opre.43.6.1058
- [4] Andrea D'Ariano, Dario Pacciarelli, and Marco Pranzo. 2007. A branch and bound algorithm for scheduling trains in a railway network. *European Journal of Operational Research* 183, 2 (2007), 643–657. doi:10.1016/j.ejor.2006.10.034
- [5] Jie Fu, Bin Yang, Zhixing Chang, Yuanrong Zhang, Jiarui Wang, Xiaotong Wang, and Lei Wang. 2025. Integrated Production–Logistics Scheduling in Flexible Assembly Shops Using an Improved Genetic Algorithm. *Machines* 13, 12 (2025), 1090.
- [6] Seyed Mahdi Homayouni and Dalila B. M. M. Fontes. 2021. Production and Transport Scheduling in Flexible Job Shop Manufacturing Systems. *Journal of Global Optimization* 79, 2 (2021), 463–502. doi:10.1007/s10898-021-00992-6
- [7] Jeonghyeon Kim and Junwoo Kim. 2026. Congestion-Aware Scheduling for Large Fleets of AGVs Using Discrete Event Simulation. *Electronics* 15, 1 (2026), 139. doi:10.3390/electronics15010139
- [8] Jürgen Kuster, Dietmar Jannach, and Gerhard Friedrich. 2007. Local Rescheduling: A novel approach for efficient response to schedule disruptions. In *2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Scheduling (CISched)*. IEEE, 79–86. doi:10.1109/SCIS.2007.367673
- [9] Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, and Haoshuang Du. 2026. A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem. *Sensors* 26, 2 (2026), 543. doi:10.3390/s26020543
- [10] Xiangfei Lyu, Yuchuan Song, Changzheng He, Qi Lei, and Weifei Guo. 2019. Approach to Integrated Scheduling Problems Considering Optimal Number of Automated Guided Vehicles and Conflict-Free Routing in Flexible Manufacturing Systems. *IEEE Access* 7 (2019), 74909–74924. doi:10.

- 1109/ACCESS.2019.2919109
- [11] Nir Malka, Guy Shani, and Roni Stern. 2024. Online Planning for Multi Agent Path Finding in Inaccurate Maps. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 10214–10221. doi:10.1109/IROS58592.2024.10801975
 - [12] Alessandro Mascis and Dario Pacciarelli. 2002. Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European Journal of Operational Research* 143, 3 (2002), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
 - [13] Leilei Meng, Weiyao Cheng, Chaoyong Zhang, Kaizhou Gao, Biao Zhang, and Yaping Ren. 2025. Novel CP Models and CP-Assisted Meta-Heuristic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Benchmark Problem with Multi-AGV. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 55, 11 (2025), 8455–8468. doi:10.1109/TSMC.2025.3604355
 - [14] Djamilia Ouelhadj and Sanja Petrovic. 2009. A Survey of Dynamic Scheduling in Manufacturing Systems. *Journal of Scheduling* 12, 4 (2009), 417–431. doi:10.1007/s10951-008-0090-8
 - [15] Haoxiang Qin, Yi Xiang, Yuyan Han, Yuting Wang, Junqing Li, and Quanke Pan. 2026. A Knowledge Region Selection Enhanced Quality-Diversity Algorithm for Real-World Flexible Job Shop Scheduling with Automated Guided Vehicles Transportation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 164 (2026), 113352. doi:10.1016/j.engappai.2025.113352
 - [16] Velusamy Subramaniam and Amritpal Singh Raheja. 2003. mAOR: A heuristic-based reactive repair mechanism for job shop schedules. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 22, 9–10 (2003), 669–680. doi:10.1007/s00170-003-1601-6
 - [17] Jiachen Sun, Zifeng Xu, Zhenhao Yan, Lilan Liu, and Yixiang Zhang. 2023. An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems. *Sensors* 23, 9 (2023), 4526. doi:10.3390/s23094526
 - [18] Jiří Švancara, Marek Vlk, Roni Stern, Dor Atzmon, and Roman Barták. 2019. Online Multi-Agent Pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 33. 7732–7739. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017732
 - [19] Hongtao Tang, Xuwei Zhang, Jiawei Huang, Xuesong Xu, and Jiansha Lu. 2026. Integrated Scheduling of Multi-Objective Lot-Streaming Hybrid Flowshop with AGV under Dynamic Environments. *International Journal of Industrial Engineering Computations* 17, 2 (2026), 295–316. doi:10.5267/j.ijiec.2025.9.003
 - [20] Roel W. M. van Os and Twan Basten. 2026. An Exact Decomposition-Based Approach to the Conflict-Free-Transportation-Constrained Flexible Job-Shop Scheduling Problem. *Computers & Operations Research* 187 (2026), 107342. doi:10.1016/j.cor.2025.107342
 - [21] Guilherme E Vieira, Jeffrey W Herrmann, and Edward Lin. 2003. Rescheduling Manufacturing Systems: A Framework of Strategies, Policies, and Methods. *Journal of Scheduling* 6, 1 (2003), 39–62. doi:10.1023/A:1022235519958
 - [22] Bin Xin, Sai Lu, Qing Wang, and Fang Deng. 2025. A Review of Flexible Job Shop Scheduling Problems Considering Transportation Vehicles. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* 26, 3 (2025), 332–353. doi:10.1631/FITEE.2300795
 - [23] Yannik Zeiträg and José Rui Figueira. 2025. A novel machine-learning rolling horizon heuristic for dynamic lot-sizing and job shop scheduling problems. *International Journal of Production Research* 63, 12 (2025), 4563–4589.
 - [24] Hongliang Zhang, Chaoqun Qin, Wenhui Zhang, Zhenxing Xu, Gongjie Xu, and Zhenhua Gao. 2023. Energy-Saving Scheduling for Flexible Job Shop Problem with AGV Transportation Considering Emergencies. *Systems* 11, 2 (2023), 103. doi:10.3390/systems11020103
 - [25] Yulun Zhang, He Jiang, Varun Bhatt, Stefanos Nikolaidis, and Jiaoyang Li. 2024. Guidance Graph Optimization for Lifelong Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*.
 - [26] Ziyang Zhao, Shixin Liu, MengChu Zhou, Xiwang Guo, and Liang Qi. 2019. Decomposition method for new single-machine scheduling problems from steel production systems. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 17, 3 (2019), 1376–1387.
